



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Ekonomisë
Ministarstvo Ekonomije -Ministry of Economy

RAPORTI I PROGRESIT PËR PERIUDHËN
JANAR - QERSHOR 2025

I

PROGRAMIT TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË
ENERGJISË SË KOSOVËS (PZSEK)
PËR PERIUDHËN 2022 - 2025

Prishtinë, gusht 2025

Përmbajtja

1. SHKURTESAT	3
2. INFORMATA TË PËRGJITHSHME	4
2.1. PROGRESI I PËRGJITHSHËM.....	5
2.2. PROBLEMET DHE RREZIQET.....	6
2.3. SFIDAT DHE MANGËSITË	7
2.4. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET PËR HAPAT E ARDHSHËM.....	7
2.5. HAPAT E ARDHSHËM	8
3. INFORMACIONE TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E AKTIVITETEVE	8
4. SHTOJCA - MATRICA E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2025.....	11

1 Shkurtesat:

BE	Bashkimi Evropian
BRE	Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë
BRE-E	Energjia elektrike e prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme
CERT	Ekipi i komunitetit për reagim urgjent
CO ₂	Dioksidi i Karbonit
EE	Efiçienca e Energjisë
ESCO	Kompania e Shërbimit të Energjisë
VNMS	Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social
PZSE	Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë
FKEE	Fondi i Kosovës për Efiçencë të Energjisë
GS	Gazrat Serrë
IPF9	Objekti i Projektit të Infrastrukturës - Asistencë Teknike 9
KEDS	Kompania Kosovare e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
KEK	Korporata Energjetike e Kosovës
KfW	Instituti i Kredive për Rindërtim
KOSTT	Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës
Ktoe	Kilo ton ekuivalent naftë
MAShT	Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
MCAK	Llogaria e Sfidës së Mijëvjeçarit-Kosovë
MCC	Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit
ME	Ministria e Ekonomisë
MFK	Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë
MFPT	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
MMPHI	Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
MW	Mega Vat
MWt	Mega Vat termik
NO _x	Oksidet e Azotit
NQ	Ngrohja Qendrore
OSSh	Operatorët e Sistemit të Shpërndarjes
OST	Operatorët e Sistemit të Transmetimit
SAIDI	Indeksi Mesatar i Kohëzgjatjes së Ndërprerjes së Sistemit
SAIFI	Indeksi i Frekuencës Mesatare të Ndërprerjeve të Sistemit
SCADA	Kontrolli Mbikëqyrës dhe Marrja e të Dhënave
SO ₂	Dioksidi i Sulfurit
ETS BE	Sistemi i Tregtimit të Emetimeve të Bashkimit Evropian
WBIF	Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor
ZRrE	Zyra e Rregullatorit për Energji

2. INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Ministria e Ekonomisë (ME), ka hartuar Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK), për periudhën 2022-2025, i cili është miratuar më 5 shtator të vitit 2023 nga Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK).

Bazuar në nenin 7, pika 7 e Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë, Ministria e Ekonomisë (ME), ka obligim ligjor që të bëjë monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës. Prandaj Ministria ka hartuar raportin gjashtë (6) mujor janar-qershor 2025, mbi progresin e realizimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, si dhe nivelin e zbatimit të Strategjisë së Energjisë për periudhën 2022-2031, në pajtim me Rregulloren (QRK) Nr.17/2024 të Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Manualin për planifikimin, hartimin, dhe monitorimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të tyre të veprimit.

Raporti i Progresit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë për periudhën janar-qershor 2025 është hartuar, bazuar në realizimin e aktiviteteve të përcaktuara në Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025.

Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, përfshin një listë prej pesë (5) objektivash strategjike, pesëmbëdhjetë (15) objektivash specifike dhe nëntëdhjetë (90) aktiviteteve që parashihen të realizohen për zhvillimin e sektorit të energjisë.

Raporti i progresit ka për qëllim që të evidentoj shkallën e realizimit të projekteve/aktiviteteve të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën janar-qershor 2025, si dhe të evidentohen sfidat dhe të propozohen rekomandimet për vendimmarrje nga autoritetet përkatëse.

Objektivat strategjike janë:

- Objektivi 1: Përmirësimi i besueshmërisë së sistemit;
- Objektivi 2: Dekarbonizimi dhe promovimi i energjisë së ripërtëritshme;
- Objektivi 3: Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE);
- Objektivi 4: Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe funksionimit të tregut;
- Objektivi 5: Mbrojtja dhe fuqizimi i konsumatorëve.

2.1. PROGRESI I PËRGJITHSHËM

Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025 për vitin 2025 janë paraparë të përfundohen gjithsej tridhjetë (30) aktivitete, por janë edhe njëzet e gjashtë (26) aktivitete të tjera të cilat janë bartur nga viti 2023 dhe viti 2024. Nga viti 2023 janë bartur gjithsej njëmbëdhjetë (11) aktivitete ndërsa nga viti 2024 janë bartur pesëmbëdhjetë (15) aktivitete. Nga gjithsej pesëdhjetë e gjashtë (56) aktivitete në gjashtë (6) mujorin e parë të vitit 2025 vetëm në dyzet (40) prej tyre ka pasur progres, ndërsa në gjashtëmbëdhjetë (16) aktivitete nuk ka pasur progres.


Objektivi një (1) i PZSEK-së është realizuar tridhjetë e nëntë përqind (39%) në periudhën janar-qershor 2025, objektivi dy (2) tridhjetë e tetë për qind (38%), objektivi tre (3) dyzet e nëntë për qind (49%), objektivi katër (4) njëzet e një për qind (21%) dhe objektivi pesë (5) është realizuar tetëdhjetë për qind (80%).

Në vazhdim janë paraqitur arritjet e realizimit të objektivave në formë tabelare dhe grafike:

Tabela 1. Përqindja e realizimit të objektivave janar - qershor 2025

	janar - qershor 2025
Objektivi 1	39%
Objektivi 2	38%
Objektivi 3	49%
Objektivi 4	21%
Objektivi 5	80%
Totali i zbatimit të objektivave	45%

Figura 1. Përqindja e realizimit të objektivave janar - qershor 2025

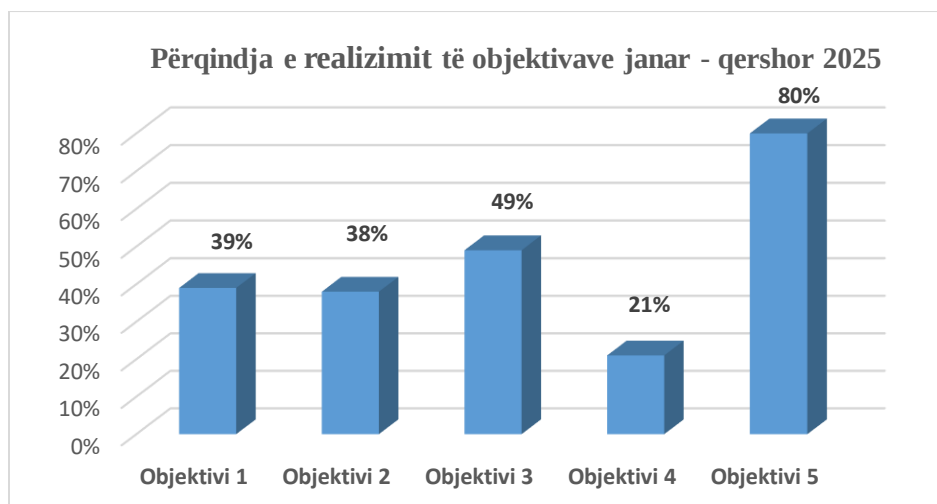


Totali i realizimit të objektivave për periudhën janar- qershor 2025 është dyzet e pesë për qind (45%).

Për periudhën janar - qershor 2025, vetëm tri (3) aktivitete apo pesë pikë tridhjetë e gjashtë për qind (5.36%) janë realizuar plotësisht, pjesërisht janë realizuar gjithsej tridhjetë e shtatë (37) aktivitete apo gjashtëdhjetë e gjashtë pikë zero shtatë për qind (66.07%), ndërsa aktivitete të cilat nuk janë realizuar janë gjashtëmbëdhjetë (16) apo njëzet e tetë pikë pesëdhjetë e shtatë për qind (28.57%).

Në vazhdim të dhënat e mësipërme janë të paraqitura edhe në formë grafike:

Figura 2. Përqindja e realizimit të aktiviteteve për periudhën janar - qershor 2025

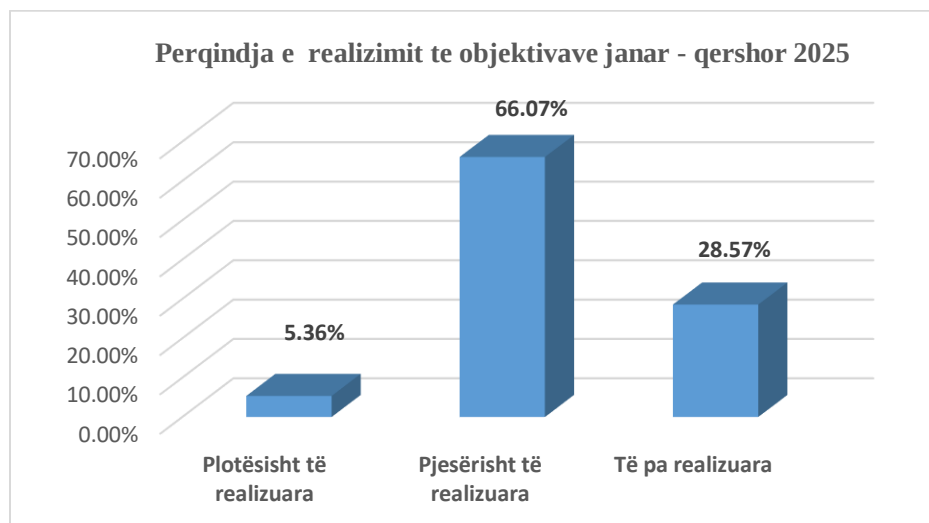

Objektivi me realizueshmërinë më të mirë për periudhën janar- qershor 2025 është objektivi i pestë (5), respektivisht - mbrojtja dhe fuqizimi i konsumatorëve, ndërsa objektivi i cili ka pasur realizueshmërinë më të ulët për këtë periudhë është objektivi i katërt (4), respektivisht - forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe funksionimi i tregut.

2.2. PROBLEMET DHE RREZIQET

Ky monitorim është bërë duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse ku janë identifikuar rreziqet të cilat do të adresohen në vitet e ardhshme me masa konkrete. Ministria e Ekonomisë (ME), do të vazhdoj bashkëpunimin dhe koordinimin me institucionet relevante dhe ndërmarrjet kryesore të sektorit të energjisë në adresimin e të gjitha rreziqeve me të cilat vazhdojnë të ballafaqohen.

Gjatë monitorimit të zbatimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën janar-qershor 2025, janë hasur disa rreziqe të cilat ndërlidhen me

kapacitetin institucional, kapacitetin financiar, mjedisin rregullator, partneritetin dhe angazhimin e institucioneve të tjera, si dhe faktorë të tjerë të jashtëm që janë shfaqur gjatë realizimit të aktiviteteve, dhe që ndikojnë në zbatimin e dokumentit strategjik.

Konstatimi i ngecjeve në realizimin e disa projekteve të parapara na drejton në marrjen e hapave të domosdoshëm dhe konkret në eliminimin e barrierave që pengojnë zhvillimin e sektorit të energjisë. Planifikimi i projekteve dhe aktiviteteve nga institucionet përgjegjëse për energji elektrike, është mjaft i rëndësishëm në suksesin dhe zhvillimin e sektorit të energjisë. Një rol të rëndësishëm luan edhe lehtësimi i procedurave të shumta me qëllim të mos vonesës dhe ngecjes së projekteve.

2.3. SFIDAT DHE MANGËSITË

Sfidat, mangësitë dhe pengesat e hasura gjatë monitorimit të këtij dokumenti janë të njëta me ato të cilat janë paraqitur edhe në monitorimin e zbatimit për vitet 2023-2024.

Gjatë realizimit të projekteve dhe aktiviteteve të parapara, institucionet përgjegjëse kanë sfida, mangësi dhe pengesa varësisht nga natyra e projekteve. Si sfida të paraqitura janë: vonesa në marrjen e lejeve nga institucionet përkatëse për ndërtim, vonesa në procese të prokurimit, zbatimi i projekteve në afërsi të lokacioneve të projektit që janë paraparë për zhvillim, mospërdorimi i pajisjeve inteligjente të pajisura me mbrojtje kibernetike brenda infrastrukturës ekzistuese të rrjetit të shpërndarjes, qasja në banesa të konsumatorëve mungesa e ekspertëve, si dhe proceset të tjera të karakterit vendore dhe ndërkombëtare, të cilat potencialisht kanë ndikuar në vonesa në realizimin e aktiviteteve.

2.4. KONKLuzionet dhe Rekomandimet për Hapat e Ardhshëm

Gjatë monitorimit të Raportit të Progresit për periudhën janar–qershor 2025, është evidentuar se realizimi i aktiviteteve ka arritur në dyzet e pesë për qind (45 %).

Disa nga faktorët që kanë ndikuar në ngadalësimin e zbatimit përfshijnë: mosratifikimin e marrëveshjeve financiare në Parlamentin e Republikës së Kosovës (PRK), planifikimin jo të përshtatshëm të afateve kohore për implementimin e aktiviteteve, si dhe varësinë e disa prej tyre nga dokumente strategjike dhe programe që është dashur të miratohen dhe të hyjnë në fuqi paraprakisht.

Përveç këtyre, si faktorë pengues janë identifikuar procedurat e shumta për marrjen e lejeve të ndryshme dhe proceset e prokurimit. Gjithashtu, është vërejtur mungesë e fuqisë punëtore me profile të specializuara, e cila ka ndikuar në dinamikën e zbatimit.

2.5. HAPAT E ARDHSHËM

Hapat e ardhshëm, të bazuara në konkluzionet dhe gjetjet nga raportimi i institucioneve mbi zbatimin e aktiviteteve dhe masave në kuadër të objektivave strategjike, përfshijnë:

- Përmirësimin e planifikimit të afateve kohore për miratimin e kornizës ligjore;
- Planifikim më të saktë të aktiviteteve dhe përcaktimin e afateve të realizimit të projekteve nga institucionet, duke marrë parasysh pengesat dhe sfidat e mundshme gjatë zbatimit;
- Nënshkrimin dhe ratifikimin në kohë të marrëveshjeve financiare nga institucionet përgjegjëse;
- Përfshirjen aktive të palëve të interesit me qëllim përshejtimin e proceseve.

2 INFORMACIONE TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E AKTIVITETEVE

Objektivi 1: Përmirësimi i Besueshmërisë së Sistemit

Përmirësimi i besueshmërisë së sistemit, përfshin të gjitha aktivitetet që garantojnë sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe funksionimin e një sistemi elektroenergjetik stabil.

Aktivitetet e parapara dhe të cilat kanë pasur zhvillime në këtë periudhë, që kanë ndikuar në përmirësimin e besueshmërisë së sistemit, janë:

- Investimet kapitale në Teknologjinë Informative (TI) ku janë bërë përparime të rëndësishme në zhvillimin dhe përmirësimin e sistemeve të IT-së;
- Projektet e tensionit të Mesëm 35/10 (20) kV është arritur një progres i konsiderueshëm në realizimin e implementimit të projekteve investive në rrjetin e tensionit të mesëm pothuajse në të gjithë territorin e vendit, me fokus të veçantë në rajonet: Prishtinë, Drenas, Fushë-Kosovë, Podujevë, Gjakovë, Malishevë, Rahovec, Pejë, Deçan, Ferizaj, Prizren, Suharekë, Viti, Vushtrri.
- Projektet e tensionit të Lartë 110/10 (20) kV ku është përfunduar ndërtimi i nënstacionit Ferizaj 3, si dhe janë marrë kushtet ndërtimore, ndërsa për nënstacionin Malisheva është në pritje të lejes ndërtimore.

Objektivi 2: Dekarbonizimi dhe Promovimi i Energjisë së Ripërtëritshme

Në periudhën janar – qershor 2025 është shënuar progres në hartimin dhe draftimin e disa dokumenteve, si dhe në zhvillimin e disa projekteve të rëndësishme:

- Hartimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji No.08/L-258 për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE). Prej tyre katër (4) akte nënligjore, tashmë janë të hartuara dhe pas diskutimeve relevante brenda ME-së, pritet të dërgohen në procesin e konsultimit paraprak dhe publik, ndërsa tri (3) akte të tjera janë në fazën e hartimit. Në kuadër të mbështetjes teknike me projektin e LUXDeV Janë hartuar edhe tri (3) Udhëzime Administrative për promovimin dhe lehtësimin e integritetit të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) dhe praktikave të Eficiencës së Energjisë (EE);
- Janë siguruar pëlqimet dhe lejet e nevojshme, si dhe janë përfunduar procedurat për projektin e ngrohjes qendrore diellore Solar4Kosovo. Është shpallur tenderi për Lot 1 të impiantit të ngrohjes qendrore “Solar4Kosovo SDH II”, ndërsa është në fazë parapërgatitore procesi i tenderimit për ekzekutimin e punimeve të projektit “Solar4Kosovo SDH II”;
- Në kuadër të promovimit të kapaciteteve të reja gjeneruese përmes ankandëve, është përfunduar faza e parë e kualifikimeve për ankandin e energjisë nga era, ndërsa procesi është në fazën përgatitore për shpalljen e fazës së dytë të propozimeve. Njëkohësisht, për ankandin solar është finalizuar procesi i përzgjedhjes së Inxhinierit të Pavarur. Po ashtu, për përgatitjen e ankandëve të ardhshme për energjinë nga era, Ministria e Ekonomisë (ME), është duke finalizuar procedurat për nënshkrimin e marrëveshjes së grantit që do të mundësojë vendosjen e matësve të erës.

Objektivi 3: Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE)

Gjatë periudhës janar– qershor 2025, një sërë aktiviteteve të zhvilluara kanë kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e Eficiencës së Energjisë (EE), në përputhje me objektivat e përcaktuara në këtë fushë.

Aktivitetet kryesore përfshijnë:

- Është avancuar tutje në parapërgatitje për projektin për rritjen e kapacitetit termik të Kogjenerimit TC “Kosova B” nga 140 MWth në 280 MWth;
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (niveli qendror);
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (në nivel komunal);
- Ka vazhduar instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorët e “Termokosit”;
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial (shtëpi individuale);
- Hartimi i Projektligjit për Eficiencë të Energjisë (EE), ende është në proces të diskutimeve relevante brenda institucionit të ME-së dhe posa të përfundoj kjo fazë, pritet me pas të dërgohet tutje për diskutim paraprak dhe publik. Ka dinamikë të shtuar edhe në procesin e hartimit të akteve nënligjore që dalin nga Projektligji i Eficiencës së Energjisë (EE);

- Është bërë avancim sa i përket miratimit të akteve nënligjore lidhur me Performancën Energjetike të Ndërtesave.

Objektivi 4: Forcimi i Bashkëpunimit Rajonal dhe Funkcionimit të Tregut

Gjatë periudhës janar–qershor 2025, aktivitetet në kuadër të këtij objekti kanë qenë të kufizuara, kryesisht për shkak të varësisë së tyre nga procesi i miratimit të Ligjeve për sektorin energjisë (Projektligji për Energjinë, Projektligji për Energjinë Elektrike dhe Projektligji për Rregullatorin e Energjisë), që transpozojnë Pakon e Energjisë së Pastër në zbatimin të obligimeve të Republikës së Kosovës (RK) ndaj Traktatit të Komunitetit të Energjisë (TKE), si dhe nga mbështetja e programit MCAK.

Evidentohet që Projektligji për Energjinë dhe Projektligji për Energjinë Elektrike kanë përfunduar procesin e konsultimeve paraprake dhe publike, si dhe janë marrë opinionet për vlerësimin e ndikimit financiar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT), dhe përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së, nga Zyra e Kryeministrit, ndërsa Projektligji për Rregullatorin e Energjisë është gati për tu procesuar në konsultim paraprak dhe publik.

Korniza ligjore e energjisë, e cila ndodhet në proces të trajtimit nuk kam mundur të procedohet tutje si rezultat i vonësës së krijimit të institucioneve të reja, pas procesit të fundit zgjedhore apo edhe kufizimet ligjore të Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK) në detyrë.

Ndërsa, vonesa në raport me procesin e implementimit të metejm të programit MCAK, ka ndodhur si rezultat i nënshkrimit të Urdhërit Ekzekutiv 14169 nga Presidenti i ShBA-së më 20 janar 2025, i cili ka rezultuar në pezullimin e aktiviteteve në kuadër të projektit të MCAK deri të fund të kësaj periudhe raportues.

Objektivi 5: Mbrojtja dhe Fugizimi i Konsumatorëve

Gjatë periudhës janar–qershor 2025, janë realizuar disa nga aktivitetet e planifikuara në kuadër të objektivit pesë (5):

- mbështetje të konsumatorëve të cenueshëm, i cili ka zëvendësuar skemën ekzistuese të mbështetjes për këtë kategori;
- ka vazhduar trajnimit të zyrtarëve të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK), me qëllim ngritjen e kapaciteteve për monitorimin, vlerësimin, verifikimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.

3 SHTOJCA- MATRICA E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2025

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK-SË PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

SO1: PËRMIRËSIMI I BESUESHMËRISË SË SISTEMIT

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet.	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektiv i i vitit të fundit 2031	Rezultati					
I.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 1: PËRMIRËSIMI I BESUESHMËRISË SË SISTEMIT										
1	Indikatori: Indeksi mesatar i kohëzgjatjes së ndërprerjes së sistemit (SAIDI).	SAIDI: 80.83 orë/vit (2021)		SAIDI: 63 orë/vit	SAIDI: 51.84 orë/vit						
2	Indikatori: Indeksi mesatar i frekuencës së ndërprerjeve të sistemit (SAIFI).	SAIFI: 58.27 (2021)		SAIFI: 49	SAIFI: 40.86						
I.1	Objektivi specifik: Rritja e fleksibilitetit të sistemit										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektiv i i vitit të fundit 2031						
1	Niveli i kapacitetit rregullues fleksibil.	5 MW (2022)		5 MW	170 MW						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

I.1.1	Përgatitja e parafizibilitetit, fizibilitetit dhe projekteve teknike për sistemin e ruajtjes së baterive.	2025	€ -	\$ 1,180,837.00	\$ 3,078,637.00	\$ 242,079.00	Donatorë	MCC, ME KOSTT	Dokumenta cioni teknik i përgatitur.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022 - 2031	Nëntëdhjetë për qind (90%) Është hartuar drafti i dizajnit final për sistemet e ruajtjes së energjisë përmes baterive dhe është përgatitur draft dosja e tenderit për sistemet e ruajtjes së energjisë. Po ashtu edhe vlerësimi i aplikimeve për parakualifikimin për tenderin e ndërtimit të sistemeve të ruajtjes së energjisë është draftuar.
I.1.2	Mbështetje teknike dhe ligjore për integrimin e baterive - Projekti i MCC	2025	€ -	\$ 1,916,000.00	\$ 2,034,667.00	\$ 2,045,667.00	Donatorë	MCC, ME KOSTT	Dokumenta cioni teknik i përgatitur.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Tetëdhjetë për qind (80%) Janë hartuar termat e referencës dhe draft Marreveshjet me Entitetet Implementuese për hartimin e legjislacionit sekondar që mundëson operimin e sistemeve të ruajtjes së energjisë me bateri.
I.1.3	Master Plani i Zhvillimit të Gazit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor (VNM).	2023	€ 750,000.00	€ 750,000.00	€ -	€ -	WBIF / IPF9	ME, MMPHI, MINT	Masterplan i i Gazit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor (VNM) i Finalizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka përfunduar në vitin 2023.
I.1.4	Studimi i fizibilitetit për Gazsjellësin e Interkoneksionit të Maqedonisë Veriore – Kosovë.	2023	€ 325,000.00	€ 325,000.00	€ -	€ -	WBIF/IPF9	ME, MMPHI, MINT	Studimi i fizibilitetit i finalizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën	Ka përfunduar në vitin 2023.

										n 2022-2031	
I.1.5	Studim për identifikimin e potencialit të energjisë gjeotermale në Kosovë.	2025				€ 750,000.00	Donatorët	ME	Studimi i fizibilitetit i realizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
I.2	Objektivi specifik: Modernizimi i rrjeteve dhe reduktimi i humbjeve në rrjet										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektiv i i vitit të fundit 2031					
1	Humbjet në shpërndarje	18.48% [2021]		13.3 %		9%					
2	Sasia e kapacitetit variabil të BRE-ve, që rrjeti është në gjendje të tajtojë/integrojë	147 MW [2021]		500 MW		2000 MW					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.2.1	Zhvillimi i sistemit (SCADA & Telekomunikacion).	Vjetore	€ -	€ 5,684,923.33	€ 4,063,814.93	€ 1,863,702.50	KOSTT	KOSTT	Kërkesat e ENTSO-E janë plotësuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Dhjetë për qind (10%) Ky projekt i takon grupit të projekteve që do të realizohen me bankën Gjermane KfW faza e VII . Është nënshkruar kontrata për shërbime konsulente më 26 nëntor 2024 për përgatitjen e specifikimit teknik dhe tender dosjen. Është përgatitur dokumenti final Inception Report dhe draft dokumenti Upcoming open Calls.
I.2.2	Përforcimi dhe rehabilitimi i rrjetit ekzistues të energjisë (OST)	Vjetore	€ 2,400,000.00	€ 2,260,000.00	€ 1,063,542.37	€ 1,354,203.39	KOSTT	KOSTT	Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së rrjetit	Strategjia e Energjisë për periudhën	

										n 2022-2031	Dhjetë për qind (10%)
I.2.3	Ndërtimi i kapaciteteve të reja të transmetimit dhe kapaciteteve transformuese - Reaktori shunt-variabël (100 MWAr).	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ -	€ 3,449,152.54	KOSTT	KOSTT	Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së rrjetit. Plotësimi i kërkesave të Kodit të Rrjetit.	Strategjia e Energjisë për periudhë n 2022-2031	Ky projekt i takon grupit të projekteve që do të realizohen me bankën Gjermane KfW faza e VII. Është nënshkruar kontrata për shërbime konsulente më 26 nëntor 2024 për përgatitjen e specifikimit teknik dhe tender dosjen. Është përgatitur dokumenti final Inception Report dhe draft dokumenti Upcoming open Calls.
I.2.4	Mbështetja e ngarkesës/ Nyjet e reja 110/10 (20) kV (OST & OSSh) (SS Katrioti - Ferizaj 3 dhe TS Malisheva" (SS Katrioti - Ferizaj 3 and TS Malisheva.	Vjetore	€ 3,000,000.00	€ 5,061,277.00	€ 10,094,931.52	€ -	KOSTT	KOSTT	Reduktimi i humbjeve të energjisë dhe fuqisë së pashërbyer.	Strategjia e Energjisë për periudhë n 2022-2031	Tetëdhjetë e pesë për qind (85%) 1. Projekti “Ndërtimi I NS 110/35/10(20) kV Ferizaji 3” ka përfunduar. 2.Sipas ligjeve në fuqi është përgaditur Dizajni për nënstacionin e NS Malisheva , nga kompania dizajnuese, janë marrë kushtet ndërtimore, pritet edhe leja e ndërtimit nga MMPHI-ja. Është përgatitur specifikimi teknik dhe është hapë periudha tenderuese.
I.2.5	Projektet e Tensionit të Mesëm 35/10(20) kV	Vjetore	€ 9,247,735.33	€ 13,216,444.00	€ 8,800,613.00	€ 7,232,203.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhë n 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit	Gjashtëdhjetë e dy për qind (62%) 4,507,520.08 € Projektet e planifikuara për investim në nivelin e tensionit të mesëm janë dizajnuar për të mundësuar furnizim të sigurt dhe të pandërprerë me energji për konsumatorët. Në vitin 2025, janë implementuar projekte investive në rrjetin e tensionit të mesëm pothuajse në të gjithë territorin e vendit, me fokus të veçantë në

										të Shpërnda rjes për periudhën 2023-2027 rajonet: Prishtinë, Drenas, Fushë - Kosovë, Podujevë, Gjakovë, Malishevë, Rahovec, Pejë, Deçan, Ferizaj, Prizren, Suharekë, Viti, Vushtrri. Deri më tani, është arritur një progres i konsiderueshëm në realizimin e këtyre projekteve. Përfitimet nga këto projekte janë: • Sigurimi dhe rritja e kualitetit të furnizimit me energji elektrike • Eliminimi i fyteve të ngushta; • Zvogëlimi i humbjeve teknike; • Përmirësimi i rënieve të tensionit deri te konsumatori fundor; • Shtimi i kapaciteteve bartëse (dalje të reja) në raport me rritjen e ngarkesës; • Rehabilitimi dhe modernizimi i linjave dhe nënstacioneve/stabilimenteve; • Rehabilitimi topologjik i linjave për shkak të vjetërsisë dhe rrezikshmërisë; • Përgatitja e linjave për kalim në nivelin 20 [kV].
I.2.6	Projektet e Tensionit të Vogël 0.4 kV	Vjetore	€ 6,086,381.41	€ 7,025,149.00	€ 13,795,229.00	€ 9,677,563.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike. Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërnda rjes për periudhë	Tridhjetë e pesë për qind (35%) 3,404,583.12€ Investimet në rrjetin e tensionit të ulët janë orientuar në përforcimin e rrjetit ekzistues dhe zgjerimin e rrjetit. Projektet e tipit “Lidhjet e reja”, të cilat implementohen nga OSSh, gjithashtu klasifikohen si pjesë e zgjerimit të rrjetit. Deri më tani, është shënuar një progres i dukshëm në realizimin e projekteve, me përfundimin e një numri të konsiderueshëm të tyre. Në vitin 2025, janë implementuar projekte investive në rrjetin e tensionit të mesëm pothuajse në të

									n 2023-2027	gjithë territorin e vendit, me fokus të veçantë në rajonet: Prishtinë, Drenas, Obiliq, Podujevë, Gjakovë, Malishevë, Rahovec, Pejë, Deçan, Klinë, Ferizaj, Lipjan, Shtime, Prizren, Suharekë, Mitrovica Veriore, Vushtrri, Skenderaj dhe Viti. Investimet e bëra në projektet e tensionit të ulët përfshijnë: • Transformatorë të rinj në zonat që kanë nevojë për investime; • Zëvendësimi i transformatorëve ekzistues me ata të ri; për rritjen e kapacitetit; • Rehabilitimi i rrjetit të tensionit të ulët; • Përforcimi i rrjetit të tensionit të mesëm brenda fushëveprimit të projekteve të TU, në përputhje me planet e ardhshme të daljeve të TM; • Zgjerimi i rrjetit të TM për kyçjen e transformatorëve të ri.
"I.2.7	Rrjeti i zgjuar (Smart Grid)	Vjetore	€ 14,513.93	€ 2,413,843.29	€ 3,444,527.64	€ 1,765,071.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike. Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	Njëzet e katër për qind (24%) 432,114.23€ Gjatë vitit 2025 janë realizuar investime të rëndësishme në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, të cilat kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e efikasitetit operacional dhe besueshmërisë së furnizimit për konsumatorët. Në fokus të këtyre investimeve ka qenë modernizimi teknologjik i rrjetit përmes implementimit të pajisjeve të mençura (smart devices) në nyjet kryesore të shpërndarjes, të cilat mundësojnë mbikëqyrje dhe kontroll në kohë reale të parametrave të rrjetit. Gjithashtu, është zgjeruar dhe instaluar sistemi SCADA në një numër të konsiderueshëm të

								stabilimenteve, çka ka rritur kapacitetin e monitorimit, analizimit dhe ndërhyrjes së shpejtë në raste avarish. Ndërrimi dhe modernizimi i skemave mbrojtëse përmes zëvendësimit të mbrojtjeve ekzistuese me mbrojtje rele të avancuara në nënstacione ka kontribuar në përmirësimin e sigurisë dhe selektivitetit të ndërhyrjeve mbrojtëse. Një tjetër hap strategjik ka qenë fillimi dhe faza e projektimit të një prej projekteve më të rëndësishme të transformimit digjital të rrjetit: implementimi i sistemit GIS (Geographic Information System), i cili do të mundësojë menaxhim më të saktë, planifikim të optimizuar dhe ndërhyrje më efikase në rrjet përmes vizualizimit të detajuar dhe të sinkronizuar të të gjitha aseteve. Të gjitha këto investime të ndërmarra deri më tani kanë ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e monitorimit të rrjetit, identifikimin dhe lokalizimin më të shpejtë të defekteve, si dhe në rritjen e performancës së përgjithshme të sistemit shpërndarës.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

I.2.8	Instalimi i njehësorëve.	Vjetore	€ 1,612,032.60	€ 4,000,015.00	€ 2,494,035.00	€ 2,111,940.00	KEDS	KEDS	Reduktimi i humbjeve komerciale për periudhën 2022-2025 parashikohet të instalohen rreth 121,782 njehësorë të rinjë - lidhjet e reja, ndërsa parashikohet të ndërrohen rreth 86,578 njehësorë.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	Zero për qind (0%)
I.2.9	Investimet kapitale në teknologjinë informative.	Vjetore	€ 896,096.30	€ 1,544,650.00	€ 2,147,700.00	€ 1,331,800.00	KEDS	KEDS	Funksioni mi i sigurtë i OSSH-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	Pesëdhjetë e dy për qind (52%) 688,814.48€ Projektet e teknologjisë informatike janë investime me rëndësi të lartë për OSSH-në, gjatë vitit 2025, janë bërë përparime të rëndësishme në zhvillimin dhe përmirësimin e sistemeve IT-së.
I.3	Objektivi specifik: Rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese të prodhimit të energjisë elektrike										

	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektiv i i vitit të fundit 2031							
1	Numri i njësive të rinovuara të linjtit.	0 [2021]	2	3 ose 4							
2	Numri i njësive të mbyllura të linjtit.	0 [2021]	0	1 ose 2							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.3.1	Rehabilitimi i njësive të "Kosova B1"	2024	€ -	€ 7,500,000.00	€ 88,000,000.00	€ -	KEK: € 49.5 milion Granti nga BE: € 38.5 milion (Elektrofiltrat & De-Nox).	KEK, ME, ZRrE	Reduktimi i emetimit të pluhurit, NOx dhe SO ₂ Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 600 mg/ Nm	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Strategjia Zhvillim e KEK-ut për periudhën 2021-2025	Zero për qind (0%) Projekti i elektrofiltrave dhe De NOX planifikohet të realizohet në njësine B1 në vitin 2026 (prill-tetot).
I.3.2	Rehabilitimi i njësive të "Kosova B2"	2025	€ -	€ 7,500,000.00	€ -	€ 88,000,000.00	KEK - €49.5 milion EU Grant -€ 38.5 milion (Electrofilter & De-Nox)	KEK, ME, ZRrE			Zero për qind (0%) Projekti i elektrofiltrave dhe De NOX planifikohet të realizohet në njësine B2 në vitin 2027 (prill-tetor).
I.3.3	Rehabilitimi i një njësie të "Kosova A"	2024	-	€ 15,000,000.00	€ 105,000,000.00	€ -	KEK	KEK, ME, ZRrE	Rritja e kapacitetit nga 130 MW në 180 MW.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%) Shpallja e aktivitetit Faza e I/parakualifikimi është bërë më datë 23 janar 2025. Disa herë është shtyrë afati i dorëzimit të dokumenteve me kërkesë të

											kompanive të interesura. Hapja zyrtare e aplikimit të Operatorëve Ekonomikë (OE), është bërë më datë 17 korrik 2025, pas hedhjes poshtë të ankesës së operatorit nga Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP).
I.3.4	Makineri, shirita transportues, shpronësime dhe investime të tjera në shpronësimin e minierave.	2024	€ 3,800,00 0.00	€ 48,200,00 0.00	€ 28,340,00 0.00	€ 28,340,00 0.00	KEK	KEK, ME, ZRrE	Investimet në minierë	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nëntëdhjetë për qind (90%) Shpronësim në hapësirën 100 ha është finalizuar, kanë mbetur vetëm disa prona të cilat do të shpronësohen sipas ligjit për shpronësim. Pjesa më e madhe e shpronësimit është realizuar në vitin 2024, pjesa e mbetur në periudhën janar - qershor 2025.
I.4	Objektivi specifik: Garantimi i sigurisë kibernetike të sektorit të energjisë										
	Indikatori	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025		Objektiv i i vitit të fundit 2031				
1	Aftësitë e reagimit kibernetik.	Nuk ekziston			Ekzistojnë		Ekzistojnë				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.4.1	Miratimi i ligjit për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	2022	€ 120,000.00	€ -	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MPB, ME,	Ligji i adoptuar	Raporti i Performancës Vjetore	Njëqind për qind (100%) Ligji për Sigurinë Kibernetike ka përfunduar në vitin 2023. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=70933
I.4.2	Miratimi i akteve nënligjore që rrjedhin nga ligji për sigurinë e rrjeteve dhe	2023	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MPB, ME,ZRrE, KOSTT	Legjislacioni sekondar i aprovuar.	Ligji për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve	Shtatëdhjetë për qind (70%) Aktet nënligjore që derivojnë nga Ligji Nr. 08/1-173 për Sigurinë Kibernetike/ data e publikimit: Më

	sistemeve informative.								e informati ve.	27 shkurt 2023. Aktet nënligjore të miratuara: 1. Rregullore (QRK) - Nr. 22/2023 për Detyrat dhe Përgjegjësitë e Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike/ data e publikimit: Më 5 janar 2024. 2. Rregullore (MPB) Nr. 02/2025 për Përcaktimin e Procedurës së Punës dhe Funksionimit të Këshillit Shtetëror për Siguri Kibernetike/data e publikimit: Më 4 prill 2025. 3. Udhëzim Administrativ (MPB) Nr. 11/2024 për Kompetencat, Mandatin dhe Përbërjen e Komisionit të Ankesave Kundër Vendimeve të Agjencisë për Siguri Kibernetike/data e publikimit: Më 26 dhjetor 2024. 4. Udhëzim Administrativ (MPB) Nr. 08/2024 për Masat dhe Procedurat që Kufizojnë ose Pezullojnë Përkohësisht Përdorimin ose Qasjen në Sistemet e Rrjetit apo Informacionit në Rast të Incidentit Kibernetik/data e publikimit: Më 9 tetor 2024. 5. Udhëzimi Administrativ (MPB) Nr. 05/2024 për Regjistrin e Rreziqeve dhe Kërcënimeve të Sigurisë Kibernetike/data e publikimit: Më 3 shtator 2024. 6. Udhëzimi Administrativ (MPB) Nr.03/2024 për Peocedurën e Njoftimit dhe Përmbajtjen e Raportit të Incidentit Kibernetik/data e publikimit: Më 27 gusht 2024. 7. Udhëzimi Administrativ (MPB) 04/2024 për Regjistrin e Incidenteve Kibernetike/data e publikimit: Më 27 gusht 2024.
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

											8. Rregullore (ZKM) Nr. 05/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë për Siguri Kibernetike/data e publikimit: Më 7 mars 2024.
I.4.3	Themelimi i Ekipit Sektorial të Energjisë për Reagim ndaj Emergjencave Kompjuterike (eCERT) në Kosovë.	2025	€ -	€ 252,250.00	€ 300,000.00	€ 50,000.00	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët .	ME, CERTi nacional , MPB, ZRrE, KOSTT , KEK, KEDS	Ekipi Sektorial i Energjisë për Reagim Emergjent (eCERT) në Kosovë i themeluar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pesëdhjetë për qind (50%) Termat e Referencës për formimin e eCERT të përfunduar.

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 2

SO2: DEKARBONIZIMI DHE PROMOVIMI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objekti vi i vitit të fundit 2031	Rezultati
II.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 2: DEKARBONIZIMI DHE PROMOVIMI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME				
1	Reduktimi i emetimit të Gazrave Serrë (GS) në sektorin e energjisë elektrike krahasuar me vitin 2019.	0% [2019] (6316 ktCO2)	0%	-32%	

2	Pjesëmarrja e burimeve të ripërtëritshme në konsumin e sektorit të energjisë elektrike (BRE).	6.3% [2021]	Minimum 13%	Minimum 35%							
II.1	Objektivi specifik: Zbatimi gradual i çmimit të karbonit										
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objekti vi i vitit të fundit 2031							
1	Futja graduale e çmimit të karbonit.	Nuk është prezantuar [2021]	Ka përfunduar përgatitja për një sistem të caktimit të çmimit të karbonit.	Integrimi në STE në e BE-së							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
II.1.1	Hartimi i Strategjisë Afatgjate të Dekarbonizimit.	2024	€ -	€ 37,228.13	€ 32,228.13	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI	Strategjia e draftuar dhe aprovuar.	Draftligji për Ndryshimet Klimatike.	Zero për qind (0%)
II.1.2	Transpozimi dhe zbatimi i MRR (BE) 2018/2066, AVR (EU) 2018/2067, dhe rregulloreve AR (KE) 765/2008	2025	€ -	€ -	€ 26,296.00	€ 26,296.00	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI	Rregullorja e Transpozuar Lidhur me Monitorimin, Raportimin dhe Verifikimin.	Draftligji për Ndryshimet Klimatike.	Zero për qind (0%)

II.1.3	Ngritja e infrastrukturës mbështetëse dhe sistemit të qeverisjes.	2025	€ -	€ -	€ 13,000.00	€ 13,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, MMPHI	Funksionali zimi i sistemit të qeverisjes për monitorimin, raportimin dhe verifikimin e emetimeve të karbonit.	Draftligji për Ndryshim et Klimatike	Zero për qind (0%)
II.1.4	Studimi i ndikimit të çmimit të karbonit.	2024-2025	€ -	€ -	€ -	€ 600,000.00	FMN	MMPHI	Studimi i përfunduar.		
II.2	Objektivi specifik: Promovimi i energjisë së ripërtëritshme në konsumin e energjisë elektrike										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objekti vi i vitit të fundit 2031					
1	Kapacitetet totale të ripërtëritshme në sektorin e energjisë elektrike (përfshirë prodhuesit vetëkonsumues).	279 MW [2021]		490 MW		1600 MW					
2	Kapaciteti i prodhuesve vetëkonsumues (prosumatorët).	2 MW (2021)		30 MW		Minimum 100 MW					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

II.2.1	Hartimi i ligjit për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (BRE).	2023	€ 12,00 0.00	€ 2,000.00	€ -	€ -	ME, donatorët	ME	Ligji për BRE-të i hartuar dhe i aprovuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
II.2.2	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me ligjin për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (BRE).	2024	€ -	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ -	ME, donatorët	ME, ZRRë	Legjislacion i sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Shtatëdhjetë për qind (70%) 1. Projekt Udhëzimi Administrativ (UA) për Cakun Kombëtar të Energjisë nga Burimet e Ripërtërishme - drafti është komentuar dhe është i gatshëm për procedim për diskutim paraprak dhe publik. 2.Projekt Rregullore për përcaktimin e skemave të certifikimit ose skemat ekuivalente të kualifikimit- 3. Projekt Udhëzimi Administrativ (UA) për caktimin e afateve dhe kushteve për dhënien e mbështetjes për prodhimin e energjisë termike nga Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (BRE) ose bashkëprodhimi me efikasitet të lartë është hartuar drafti dhe jemi në pritje të komenteve nga anëtarët e Grupit Punues (GP) që drafti të hidhet ne diskutim paraprak dhe publik. 4. Projekt Udhëzimi Administrativ (UA) për përcaktimin e masave për rritjen e pjesëmarrjes së Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (BRE) në sektorin e ngrohjes dhe ftohjes-jemi në pritje të komenteve nga anëtarët e Grupit Punues (GP) dhe pas trajtimit të komenteve, drafti do të jetë i gatshëm të hidhet në

											diskutim paraprak dhe publik. 5. Projekt Udhëzimi Administrativ (UA) për One Stop Shop për Burimet e Ripërtërsihme të Energjisë (BRE) - jemi në pritje të komenteve nga anëtarët e Grupit Punues (GP) që drafti të hidhet në diskutim paraprak dhe publik. 6. Projekt Udhëzimi Administrativ (UA) për llogaritjen e të gjitha llojeve të burimeve të energjisë në energjinë e shitur elektrike dhe menyrën e kontrollit për llogaritjet, jemi në pritje të komenteve nga anëtarët e Grupit Punues (GP) dhe pas trajtimit të komenteve, drafti do të jetë i gatshëm të hidhet në diskutim paraprak dhe publik. 7. Projekt Udhëzimi Administrativ (UA) për llogaritjen e ndikimit të Gazrave Serrë (GS) prej biokarburanteve,biolëngjeve dhe derivatet pre biomase. Drafti është komentuar dhe është i gatshëm për procedim për diskutim paraprak dhe publik.
II.2.3	Hartimi i legjislacionit sekondar për prosumatorët.	2023	€ 6,000.00	€ -	€ -	€ -	Donatorët	ZRrE	Legjislacion i sekondar i miratuar.	Rregulla për prosumatorët.	
II.2.4	Finalizimi i metodologjisë së taksës së kyçjes së OSSh-së.	2023	€ 20,000.00	€ -	€ -	€ -	ZRrE	ERO, OSSh	Integrimi i rrjetit.	Kodi i rrjetit.	

II.2.5	Hartimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë për periudhën 2025-2030	2024		€ 30,000.00	€ 10,000.00	€ -	GIZ	ME, MMPHI	PKEK i finalizuar dhe aprovuar	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
II.2.6	Njoftimi për pilot-ankandin e parë.	2023	€ 4,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRRrE	Organizimi i ankandeve konkurruese për të rritur pjesëmarrjen e BRE-ve duke filluar me 100 MW	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka përfunduar në vitin 2023.
II.2.7	Dhënia dhe kontraktimi i ankandit të parë pilot.	2023	€ -	€ 4,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRRrE		Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka përfunduar në vitin 2024.
II.2.8	Ndërtimi i kapaciteteve prej 100 MW	2025	€ -	€ -	€ 75,000,000.00	€ -	Investim e private	ME, ZRRrE	Ndërtimi i centralit solar FV 100 MW	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Tridhjetë për qind (30%) Zhvilluesi i projektit ka siguruar lejet e nevojshme nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) dhe aktualisht është në proces të aplikimit për autorizimin final nga Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRrE). Në ndërkohë, është përfunduar rivlerësimi i procedurës së përzgjedhjes së Inxhinierit të Pavarur, dhe është përzgjedhur Operatori Ekonomik (OK) përkatës. Gjithashtu, është përgatitur kontrata për qiranë e tokës ndërmjet Komunës së

											Rahovecit dhe Ministrisë së Ekonomisë (ME).
II.2.9	Themelimi i njësisë për zhvillimin e kapaciteteve të BRE-ve.	2024	€ -	€ -	€ 36,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME	Njësia për zhvillimin e kapaciteteve nga BRE-të e themeluar.	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Gjashtëdhjetë për qind (60%)
II.2.10	Ndërtimi i centralit diellor 100 MW në KEK	2025	€ -	€ 500,000.00	€ 65,000,000.00	€ 40,000,000.00	10,000,000 € KEK Donacion nga KfW, EIB Kostoja e projektit 104 milion € Tridhjetë për qind (30%) e projekti grant nga Eu, tridhjetë për qind (30 %) kredi nga KfW dhe tridhjetë për qind (30%)	KEK	Ndërtimi i centralit diellor 100 MW, që pritet të funksionalizohet në vitin 2025	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Strategjia Zhvillimore e KEK-ut për periudhën 2021-2025	Dhjetë për qind (10%) Është përgatitur dosja e tenderit për fazën e I/parakualifikuese e cila pritet të shpallet në muajin gusht 2025. Pastaj vazhdohet në fazën e dytë me kompanitë e parakualifikuar për implementimin e projektit.

							kredi nga Banka Evropiane për Investime.				
II.2. 11	Studimi i fizibilitetit për identifikimin e tokave publike të përshtatshme për FV dhe erë faza e tretë.	2023	€ -	€ 299,000.00	€ -	€ -	Komisioni Evropian	ME, MMPHI	Vlerësimi i lokacioneve të përshtatshme të BRE-ve në pronësi publike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
II.2. 12	Puna përgatitore për fillimin e ankandit të dytë specifik teknologjik.	2023-2024		€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ -	ME, donatorët	ME	Hartimi i dosjes së tenderit dhe shpallja e ankandit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pesëdhjetë për qind (50%) Vendimi për fillimin e ankandit të dytë është shpallur më 21 nëntor 2024 sipas Vendimit me Nr. Protokoli 6929. Faza e kërkesave për kualifikime ka përfunduar më datën 17 prill 2025 kurse ME është duke finalizuar procesin për shpalljen e fazës së dytë të kërkesave për propozime.

II.2 .13	Mbështetje për kapacitetet gjeneruese të erës, përfshirë përgatitjen teknike të projekteve specifike.	2025	€ -	€ 500,000.00	€ 1,000,000.00	€ 500,000.00	Donatorët	Donatorët	Studimet teknike, pajisjet matëse të erës dhe asistencë tjera teknike përkatëse.	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Dhjetë për qind (10%) Nga ana e ME-së, janë përgatitur dhe dorëzuar dokumentet ESCP dhe SEP që kanë qenë si parakusht për nënshkrimin e marrëveshjes së grantit për vendosjen e matësve të erës. Gjatë muajit maj ME-së, Banka Botërore dhe KOSTT-i kanë zhvilluar vizita në terren të lokacioneve potenciale për zhvillimin e studimeve paraprake dhe vendosjen e matësve të erës.
II.2. 14	Promovimi dhe lehtësimi i integrimit të Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (BRE), dhe praktikave të Eficiencës së Energjisë (EE).	2026		€ 264,100.00	€ 2,413,100.00	€ 1,715,300.00	Lux Dev	ME, FKEE, MMPHI	Zbatimi i masave të EE & BRE, asistimi në hartimin e kornizës rregullative për EE & BRE, dhe siguri i çasjes në mekanizmat financuese për BRE-të dhe EE-së, në shkallë të vogël.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nëntëdhjetë e pesë për qind (95%) Draftimi i udhëzuesit komunal për vetëkonsum - Ministria e Ekonomisë - Qendra e Shërbimeve me Një Ndalesë Draftimi i Udhëzimit Administrativ (ME) NR. __/2025 për Masat për Rritjen e Pjesëmarrjes së Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë në Sektorin e Ngrohjes dhe Ftofjes. Draftimi i Udhëzimit Administrativ (ME) NR. __/2025 për Afatet dhe Kushtet për Dhënien e Mbështetjes për Prodhim të Energjisë Termike nga Burimet apo Burimet e Ripërtërishme ose Bashkëprodhimi me Eficiencë të Lartë.

											Kapacitete të përmirësuara teknike dhe administrative për hartimin e ankandeve të energjisë diellore dhe të erës, integrimin e rrjetit dhe hartimin e tregut. Pajisja e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) me kapacitet të shtuar për të hartuar dhe përafruar politikat e energjisë me direktivat e BE-së, duke u përqendruar në burimet e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë, një program shumësektorial që përmirëson aftësitë e hartimit dhe zbatimit të politikave në të gjitha fushat e efikasitetit të energjisë.
II.3 Objektivi specifik:Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të energjisë së ripërtëritshme për ngrohje											
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objekti vi i vitit të fundit 2031					
1	Kapaciteti i instaluar i BRE-ve në sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ).	15 MWth		Minimum 65 MWth		Të përcaktohet nga Studimi i Fizibilitetit					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

IL3.1	Studimi i fizibilitetit & Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) për sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) në nëntë (9) komuna të Kosovës: Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pejë, Drenas, Obilq, Mitrovicë Veriore dhe Jugore & Zveçan.	2023	€ 1,000,000.00	€ 1,350,000.00	€ -	€ -	WBIF/IP F10	ME, MMPHI, Komunat , MFPT	Studimi i fizibilitetit dhe VNMS janë përfunduar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka përfunduar në vitin 2024.
IL3.2	Solar4Kosovo – Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore.	2024	€ -	€ -	€ 1,000,000.00	€ -	KfW, EBRD	Termokos	Studimi i fizibilitetit ka përfunduar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031	Nëntëdhjetë e gjashtë për qind (96%) Projekti përfshin ndërtimin e impiantit termik diellor dhe integrimin në sistemin ekzistues të Ngrohjes Qendrore (NQ) duke përfshirë zgjerimin e rrjetit deri në 50MWTH. Sa i përket zhvillimeve për këtë projekt, kanë përfunduar: 1. Studimi i fizibilitetit; 2. Projekti Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS), i punuar nga CES-iC dhe financuar nga KfW; 3. Është definuar dhe aprovuar lokacioni në zonën Hade e Re prej njëzet e pesë hektarë (25 ha) tokë, për vendosjen e paneleve solare dhe rezervuarit të energjisë ngrohëse; 4. Është nënshkruar kontrata me kompaninë konsulente për projektin, kompania iC –CES

									Consulenten nga Vienna, në muajin janar 2024. • Ndërsa, aktivitetet e realizuara dhe në proces lidhur me këtë projekt në periudhën gjashtëmujore janar – qershor 2025, janë: 1.Kemi marrë pëlqimin elektronergjetik në KEDS (kyçja e impiantit në trafon 110/10(20)kV) dhe për kushte të kycjes në rrjetin e ujësjellësit “KRU Prishtina”; 2. Është aprovuar Planing Project Report (PPR); 3. Është aprovuar në parim Masterplani i ri për zgjerimin e rrjetit në kuadër të këtij projekti; 4.Termokos ka angazhuar kompani konsulente të licencuar lidhur me elaboratin e shpronësimit/servitutit për korridoret e gypave dhe dorëzimi në Ministrin e Finacave, Punës dhe Transfereve (MFPT); 5. Është përgatitur Dizajni i optimizuar për impiantin solar termik , llogaritja e CO₂, plani i sigurisë së digës (depozitës së ujit), matjet gjeomekanike, mostrat laboratorike të dheut etj.; 6. Është angazhuar konsulenca FOPIP/ESAP, kontrata është nënshkruar në muajin maj 2025; 7.Kemi aplikuar në institucionet përkatëse për pëlqimet /lejet e nevojshme; 8. Në proces është Elaborati i shpronësimit për pjesën e trasesë për korridorin A dhe B; 9.Janë aprovuar nga KFW “Termat e Referencës” për
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											shpalljen e Tenderit për parakualifikim të kompanive të interesuara për pjesëmarrje në projekt; 10. Është shpallur tenderi për Loti 1 – Impianti i Ngrohjes Qendrore “Solar4Kosovo SDH II “, në janar 2025; 11. Ka përfunduar procesi i vlerësimit të aplikacioneve për parakualifikim për tenderin “Solar 4 Kosova II” dhe raporti i vlerësimit për parakualifikim është dërguar në bankën e KfW për miratim. Pas miratimit të këtij raporti, fillon procesi i tenderimit për ekzekutim të punimeve.
II.3.3	Ndërtimi i projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore – Solar4Kosovë.	2027	€ -		€ 45,520,162.00	€ 36,000,000.00	KfW, EBRD, WBIF, Kontributi Kombëtar.	Termokos	Energji shtesë 50 MWth nga energjia diellore për Termokosin , duke përfutuar deri në 12,000 familje.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%) Nuk ka filluar ende realizimi i projektit. Afati i fundit: 2026-2029-planifikohet realizimi i projektit . Buxheti: Gjatë vitit 2024 janë realizuar 1,235,548.00 € . Ndërsa për vitin 2025 planifikohet të realizohet shuma prej 1,032,206.00 € , nga të cilat deri në qershor 2025 janë realizuar 501,543.00 € . Burimi i financimit: KfW, EBRD,WBIF,Kontributi Kombëtar dhe Termokos.

**MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËM 2022-2025: OBJEKTIVI
STRATEGJIK 3**

SO3: RITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË (EE)

Nr.	Objekti vat strategj ike dhe specifik e, treguesi t dhe veprim et	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati
III.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: RITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË (EE)				
1	Indikato ri: Niveli i konsum it final të energjis ë.	1516 ktoe [2017]	1709 ktoe	1877 ktoe	
2	Indikato ri: Kursim et kumulat ive të energjis ë të arritura në sektorin e	2.7 ktoe [2021]	17.76 ktoe	266.4 ktoe	

	ndërtimi t.										
III.1	Objektivi specifik: Përmirësimi i Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa										
	Indikator	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031							
1	Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesa publike.	2.6 ktoe [2021]	3.3 ktoe	33.9 ktoe							
2	Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesat rezidenciale dhe komerciale.	0.1 ktoe [2021]	14.46 ktoe	232.5 ktoe							
3	Numri i ndërtesave me konsum të energjisë afër zero.	0	10	150	Improving the energy efficiency of new public buildings.						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucion i udhëheqës dhe	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

								mbështetës			
III. 1.1	Rishikimi i ligjit për Eficiencë të Energjisë (EE).	2023	€ -	€ 10,800.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, MMP HI, FKEE	Miratohet ligji për Eficiencë të Energjisë (EE).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pesëdhjetë për qind (50%) Projektligji për Eficiencën e Energjisë (EE), drafti final është hartuar nga Grupi Punues (GP) me mbështetje të konsulencës GIZ. Projektligji pritet të dërgohet për diskutim paraprak dhe publik. Gjatë kësaj periudhe janë hartu dhe katërmëdhjetë (14) akte nënligjore dhe janë zhvilluar dy (2) punëtori në kuadër të hartimit të legjislacionit sekondar. Sipas planit legjislativ është paraparë miratimi në fund të vitit 2025.
III. 1.2	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me ligjin për Eficiencën e Energjisë (EE).	2024	€ -	-	€ 90,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, MMP HI, FKEE	Miratimi i legjislacionit sekondar lidhur me ligjin për Eficiencën e Energjisë (EE).	Ligji për Eficiencën e Energjisë (EE).	Dhjetë për qind (10%) Pas miratimit të Ligjit për Eficiencë të Energjisë do të fillohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore, ku deri më tani janë identifikuar Udhëzimet Administrative (UA) dhe Rregulloret .
III. 1.3	Rishikimi i ligjit për performancën energjetike të ndërtesave.	2023	€ 22,600.00	-	-	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët	MMP HI	Ligji për performancën energjetike të ndërtesave i miratuar .	Plani Kombëtar i Zhvillimit për periudhën 2023-2025	Njëqind për qind (100%) Është miratuar dhe aprovuar Ligji Nr. 08/L-242 për Performancën Energjetike të Ndërtesave publikuar në Gazetën Zyrtare (GZ) më 12 qershor 2024.
III. 1.4	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me performancën	2024	€ 150,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	MMP HI	Miratimi i legjislacionit sekondar në lidhje me	Ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Tridhjetë për qind (30%) 1. Është hartuar drafti i rregullores për Metodologjinë Kombëtare të Përformancës Energjetike në Ndërtesa në përputhje me standardet e reja EN. 2. Është punuar në koston optimale në ndërtesa në nivelin e performancës energjetike që çon në koston më të ulët gjatë

	energjet ike të ndërtesave.								performancën energjet ike të ndërtesave.		vlerësimit të ciklit të jetëgjatësisë ekonomike për gjatë vlerësimit të tij. 3. Është hartuar Drafti fillestar Rregullore për Trajnimin Kualifikimin dhe Licencimin e Vlerësuesëve të Energjisë dhe Ekspertëve të Pavarur të Energjisë. 4. Është Hartuar Drafti fillestar i Kodit të Praktikës për Ekspert të Pavarur.
III. 1.5	Zhvillimi i regjistrit kombëtar për performancën energjet ike në ndërtesa.	2023	€ 90,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës: € 20,000 Donatorët: € 90,000	MMP HI, ME	Ekziston një regjistrë kombëtar funksional.	Ligji për EE & ligji për performancën energjet ike të ndërtesave.	Gjashtëdhjetë e pesë për qind (65%) Në kuader të përgjegjësisë së ME-së në komponenten e Auditoreve të Energjisë është bërë vendosja në sistem dhe përditësimi në bazë të certifikimit dhe licencimit, kurse për pjesën tjetër duhet të raportoj Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës (MMPHI). Projekt - platforma për centralizimin e informatave në fushën e Eficiencës së Energjisë (EE) "Regjistri Kombëtar për fushën e Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa" si sistem i instaluar në serverët e ASH-së është testuar në lëshimin e dy certifikatave të performancës energjetike në ndërtesa, tani është në fazën e përditësimit me Ligjin e ri për Përfomancën Energjetike në Ndërtesa (PEN).
III. 1.6	Hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Rinovimit të Ndërtesave.	2024	€ -	€ -	€ 25,000.00	€ -	Donatorët	MMP HI	Strategjia e Rinovimit të Ndërtesave e miratuar.	Ligji për EE & ligji për performancën energjet ike të ndërtesave.	Dhjetë për qind (10%) Nga Donatori LUX DEV janë zhvilluar procedurat e përzgjedhjes së kompanisë e cila do të harton këtë dokument, është përzgjedhur kompania dhe jemi në pritje të procedurave nga donatori për fillim të aktivitetit.
III. 1.7	Fushata për ndërgjegjësimin e publikut.	Vjetore	€ 10,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, FKKEE, MMP HI	Fushatat për ndërgjegjësimin e publikut të organizuara.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pesëdhjetë për qind (50%) Është inicuar kërkesa për publikim dhe shpallje për procedura të prokurimit.

III. 1.8	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (niveli qendror).	2023	€ -	€ 2,400,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët (BB).	ME	Dymbëdhjetë (12) ndërtesa publike në nivelin qendror (05. ktoe).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Njëqind për qind (100%) LOT 1- Renovimin e gjashtë (6) ndërtesave spitalore që gjenden në Qendren Spitalore në QKUK-punimet në katër (4) objektet spitalore kanë përfunduar në maj 2024. LOT-2 - Kontrata për renovimin e gjashtë (6) ndërtesave publike, tre (3) objekte spitalore dhe tre (3) objekte Administrative në Prishtinë, Prizren, Gjakovë dhe Gjiilan - punimet kanë përfunduar në fund të vitit 2024, dhe ka filluar periudha e garancionit prej një viti.
III. 1.9	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike (në nivelin komunal).	Vjetrore	€ 6,435,061.23	€ 9,924,938.77	€ 500,000.00	#####	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët (BE, BB-KEEREP).	FKEE	Kursimi i energjisë rreth 3 ktoe/vit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Tetëdhjetë e gjashtë për qind (86%) FKEE ka publikuar dy thirrje publike në vitin 2020 dhe 2021 me anë të cilave ka ftuar të gjitha komunat që të aplikojnë për ndërtesat publike dhe sistemet e ndriçimit të rrugëve, me qëllim të përmirësimit të Eficiencës së Energjisë (EE) në kuadër të Projektit Komunal për Eficiencë të Energjisë (EE), MEEP të mbështetur nga Banka Botërore (BB), Bashkimi Evropian (BE) dhe Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga këto thirrje janë nënshkruar njëqind e pesëdhjetë (150) Marrëveshje për Fillimin e Projektit dhe nga to për tetëdhjetë e gjashtë (86) objekte FKEE ka nënshkruar Marrëveshje për Shërbime të Energjisë me komuna. Në kuadër të këtyre projekteve janë lidhur kontrata për konsulencë (auditim energjetik, dizajn dhe mbikëqyrje) dhe ato për zbatimin e punëve. Gjatë periudhës janar-qershor 2024, është përfunduar auditimi energjetik dhe dizajni i tridhjetë e katër (34) objekteve të reja nga thirrjet publike paraprake. Për shtatëmbëdhjetë (17) prej tyre është përmbyllur procedura e tenderimit për kontratat e punëve kryesë dhe të mbikëqyrjes. Në fund të vitit 2024, janë nënshkruar marrëveshjet e shërbimit të energjisë për shtatëmbëdhjetë (17) ndërtesa me gjashtë (6) komuna të vendit tonë. Gjatë periudhës janar – qershor 2025 janë nënshkruar kontratat e punimeve me katër (4) Operatorë Ekonomikë (OE) dhe ka filluar procesi i implementimit për shtatëmbëdhjetë (17) ndërtesa publike. Një nga projektet nuk është përfunduar me sukses dhe aktualisht është në pritje të marrjes së lejes për renovim nga Qendra Rajonale për Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore (QRRTK), për të mundësuar vazhdimin e mëtejshëm të punimeve. Numri i përgjithshëm i projekteve të përfunduara deri

										më tani është tetëdhjetë e pesë (85), ndërsa vlera e kursimit të energjisë arrin në 1.7 ktoe në vit.
III. 1.1 0	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike (në nivel komunal).	2023	€ -		€ 2,500,000.00	#### ####	Buxheti i Kosovës (BK), KfW, WBIF	ME	Tetë (8) objekte shkollorë (1 ktoe).	Pesëdhjetë për qind (50%) Masat e Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike në nivel komunal në Kosovë” është në vijim, pra është në proces pranimi i pajtueshmërisë (No Objection) nga ana e KfW-se për dërgimin e kërkesë për ofertë financiare të intervenimeve në shkolla në komunat: Prishtinë, Gjiilan dhe Ferizaj, pasi këto komuna e kanë të përzgjedhur – janë para kualifikuar Operatorët Ekonomik (OE). Ky proces i negocimit të ofertës financiare, rrjedhimisht edhe përcakton fokusin në 1 apo 2 shkolla për komunë, varësisht nga oferta financiare dhe kufizimet buxhetore të planifikuara. Prandaj, numri i objekteve shkollorë do të rishikohet sëbashku me komunat përfituese. Përderisa për Komunën e Gjakovës, procesi i para kualifikimit është përsëritur, pas dështimit të mëhershëm, dhe kemi pranuar aplikimit nga Operatorët Ekonomik (OE), të cilat janë vlerësuar dhe prapë janë dërguar te KfW për pajtueshmëri (No Objection). Procesi vazhdon me miratim të vlerësimit të para kualifikimit në Gjakovë dhe përgatitjen e dokumentacionit për tender – ofertë financiare që ju përcillet Operatorëve Ekonomik (OE), ngjashëm si në rastin e komunave tjera të elaboruara më lartë.

											Planifikohet të fillojmë intervenimet, punimet në shkolla në muajt e ardhshëm, ku prioritet kanë intervenimet në shkolla në Komunën e Prishtinës për shkak të numrit të madhe të nxënësëve, andaj edhe intervenimet nevojitet të bëhen duke mos llogaritur lëvizjen e nxënësëve.
III. 1.1 1	Korniza e qyteteve të gjelbërta 2 - Efiçienca e Energjisë (EE) në ndërtesa publike në Prishtinë.	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ 2,000,000.00	#### ####	Kredi nga EBRD	Komunitat e Prishtinës	Zbatimi i masave të Efiçienës së Energjisë (EE) deri në dyzet e shtatë (47) ndërtesa në pronësi të komunës. Kursimi i energjisë 1 ktoe	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
III. 1.1 2	Zbatimi i masave të Efiçienës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike në Prizren.	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ 2,000,000.00	#### ####	Kredi nga EBRD	Komuna e Prizrenit	Zbatimi i masave të Efiçienës së Energjisë (EE) deri në dyzet e shtatë (47) ndërtesa në pronësi të komunës	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

									S. Kursimi i energjis ë 1 ktoe		
III. 1.1 3	Zbatimi i masave të Eficienc ës së Energjis ë (EE) në sektorin rezidenc ial njëzet e gjashtë (26) Ndërtes a Shumëb anesore (NShB).	2022	€ 4,850, 000.00	€ -	€ -	€ -	MMC- Millenniu m Foundatio n Kosovo	MFK, ME, Komu na	njëzet e gjashtë (26) ndërtesa shumëb anesore të rinovuar a, duke arritur kursime deri në tridhjet ë përqind (30%).	Ligji për eficienc ë të energjis ë (EE), Ligji për perform ancën energjet ike të ndërtesa ve, Plani i 4-të Kombët ar i Veprimi t për Eficienc ë të Energjis ë (EE).	
III. 1.1 4	Studimi i fizibilitet it për zbatimi n e masave të Eficienc ës së Energjis ë (EE) në sektorin rezidenc ial dhe privat.	2024	€ -	€ -	€ 200,00 0.00	€ -	Donatorët (WBIF)	FKEE	Studimi i fizibilitet it i përfund uar.	Strategji a e Energjis ë për periudh ën 2022- 2031	

III.1.15	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial (shtëpi individuale).	2024	€ -	€ 5,000,000.00	€ 5,000,000.00	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	FKEE	Kursimi i energjisë - 2 ktoe/ vit	Njëqind për qind (100%) Gjatë vitit 2023 FKEE ka publikuar “Thirrjen Publike për Aplikime” për zbatimin e Projektit Emergjent për Zbatimin e Masave të Eficiencës së Energjisë për shtëpitë individuale të banimit me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Kosovës me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) pian në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Kosovës. Nga kjo thirrje janë shqyrtuar 3321, paraaprovimet e lëshuara janë 2148, gjersa shuma e rezervuar sipas letrave të para-aprovimit është 8,230,050 € , numri i përfituesve është 2100 familje. Numri i aplikacioneve që kanë pranuar disbursimin është 1811, ndërkaq shuma është 6.7 milion € , kurse 1010 aplikacione kanë qenë në listën e pritjes (për shkak të mungesës së raportit të auditorëve). FKEE ka bërë një “Thirrje Publike” për këtë listë, dhe numri i aplikantëve që i janë përgjigjur thirrjes është 267. Këto aplikime janë verifikuar nga nëntë (9) kompani të angazhuara nga FKEE, dhe janë nënshkrua 1789 marrëveshjet. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 6,347,438.91 €. FKEE ka iniciuar procesin e trajtimit të listës së pritjes nga thirrja e parë dhe janë përgjigjur 239 shtëpi, 25 prej tyre kanë raport të auditimit energjetik ndërsa për 212 shtëpi FKEE ka iniciuar procedurë tenderuese për përgatitjen e auditimeve energjetike dhe verifikimeve të zbatimit të masave. Nga kjo listë janë nënshkruar 85 marreveshje me vlerë 301,002.06 € deri në qershor 2025. Më 26 gusht 2024 FKEE ka vazhduar me thirrjen e dytë publike për shtëpitë individuale, me shumën e caktuar prej 5 milionë € . Gjatë thirrjes së dytë janë pranuar 1296 aplikime të vlefshme, nga të cilat 1237 para-aprovime, 43 refuzime, 16 aplikues janë tërhequr nga subvencionimi. Nga kjo thirrje janë nënshkruar 1136 marrëveshjet dhe buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 4,151,445.81 € deri në qershorë 2025. FKEE ka iniciuar procesin e trajtimit të listës së pritjes nga thirrja e dytë dhe janë aprovuar 500 shtëpi. Nga kjo listë janë nënshkruar 204 marreveshje me vlerë 719,866.65 € deri në qershor 2025. Nga “Thirrjet Publike për Aplikime” për zbatimin e Projektit Emergjent për zbatimin e masave të Eficiencës së Energjisë (EE) për shtëpitë individuale të banimit vlera e kursimit të energjisë është 9 ktoe/vit.
----------	--	------	-----	----------------	----------------	-----	---------------------------------	------	-----------------------------------	--

III. 1.1 6	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial Ndërtesa Shumë Banesorë (NShB) sociale në pronësi të komunave.	2024	€ -	€ 5,000,000.00	€ 5,000,000.00	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	FKEE	Kursimi i energjisë - 2 ktoe/ vit	Strategji a e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pesëdhjetë për qind (50%) Gjatë vitit 2023 FKEE ka publikuar “Thirrjen Publike”, “Thirrjen Publike për Aplikime” për Projektin Emergjent për Masat e Eficiencës së Energjisë së Ndërtesave shumëbanesore (NShB) sociale në Pronësi të Komunave me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Kosovës me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Kosovës. Nga kjo thirrje janë nënshkruar Marrëveshjet për Inicim të Projektit për 28 Ndërtesa shumëbanesore (NShB) sociale në trembëdhjetë (13) komuna. Së fundmi FKEE ka nënshkruar “Marrëveshje Bashkë Financuese” me dymbëdhjetë (12) komuna për njëzetë e pesë (25) Ndërtesa shumëbanesore (NShB) sociale dhe nëpërmjet tetë (8) kompanive punë kryese ka filluar implementimi i Masave për Eficiencë të Energjisë në këto ndërtesa. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 3,401,205.62 €.
III. 1.1 7	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial dhe NMVM-të	2025	€ -	€ -	€ -	#### ####	Donatorët (WBIF)	FKEE	Kursimi i energjisë 0.14 ktoe	Strategji a e Energjisë për periudhën 2022-2031	

III. 1.1 8	Zbatimi i masave të Eficienc ës së Energjis ë (EE), në sektorin rezidenc ial	2022 /202 3	€ 5,000, 000.00	€ 10,000, 000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët	ME	Skemat e subvenc ionimit të pajisjev e efiçient e për ngrohje, pajisjev e efiçient e shtëpiak e & sisteme ve diellore.	Strategji a e Energjis ë për periudh ën 2022- 2031	
III. 1.1 9	Zbatimi i masave të Eficienc ës së Energjis ë (EE), në sektorin rezidenc ial Ndërma rrjet Mikro, të Vogla, dhe të Mesme – (NMV M).	2023	€ -	€ 5,000,0 00.00	€ -	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	ME	Skemat e subvenc ionimit të pajisjev e efiçient e për ngrohje, pajisjev e efiçient e të punës & sisteme ve diellore.	Strategji a e Energjis ë për periudh ën 2022- 2031	

III. 1.2 0	Instalimi i sistemeve solare FV në kompanitë rajonale të ujit (KRU).	2024	€ -	100,00 0.00	€ 14,900, 000.00	€ -	KfW	ME	Diversifikimi i burimeve të energjisë në KRU-të, rreth njëzet e gjashtë përqind (26%) e konsumit të energjisë do të mbulohet nga BRE-ja.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
III. 1.2 1	Zhvillimi i tregut ESCO	2024/2025	€ -	€ -	€ 10,000. 00	#####	Donatorët	ME	Janë zhvilluar tre lloje të kontratave model për ESCO dhe metodologji për përcaktimin e ESCO.	Udhëzimi Administrativ (UA) për Ofruesit e Shërbimeve të Energjisë.	Zero për qind (0%) Nuk ka zhvillim, Udhëzimi Administrativ (UA) do të miratohet pas aprovimit të Ligjit për Eficiencë të Energjisë (EE).
III. 2	Objektivi specifik: Promovimi i kogjenerimit efikas dhe sistemeve eficiente të Ngrohjes Qendrore (NQ)										
	Indikator	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				

1	Rritja e kapacitetit të kogjenimit në “Termokos” Prishtinë.	140 MWth	140 MWth	280 MWth							
2	Numri i konsumatorëve të lidhur në sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) Prishtinë & Gjakovë .	17,791	24,560	38,240 në Prishtinë dhe Gjakovë. Për komunitetet tjera do të vendoset në bazë të studimit të fizibilitetit.	Numri i konsumatorëve të planifikuar për vitin 2025 është -25,537 konsumator.						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucion i udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar - qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

III. 2.1	Zgjerim i dhe rehabilitim i rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) të Prishtinës.	Yearly	€ 9,200,000.00	€ 6,676,063.00	€ 2,835,663.00	#####	KfW/Termokos	Termokos	Rrjeti i Ngrohjes Qendrore (NQ) i zgjeruar dhe rehabilituar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031, Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031	Njëqind për qind (100%) Projekti për Zgjerim dhe Rehabilitim të Rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) në Prishtinë, ka përfunduar dhe gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur aktivitete për realizimin e projektit. Afati i fundit: 2025- përfundim i projektit. Buxheti: Gjatë vitit 2022 janë paguar 6,667,833.00 € – paguar nga KfW(donator) dhe Termokos (si bashkëfinancues). Gjatë vitit 2023 janë paguar 5,522,272.11 € - paguar nga KfW (donator) dhe Termokos (si bashkëfinancues). Gjatë vitit 2024 janë paguar 1,609,480.07 € - paguar nga Termokosi (bashkëfinancues). Gjatë periudhës janar – qershor 2025- nuk janë bërë pagesa. Ndërsa për periudhën korrik –dhjetor 2025 - planifikohet të paguhet nga Termokos, shuma e mbetur pa paguar për projektin prej 300,000.00 € (për testet e performances dhe përmirësimet në sistemin SCADA).
-------------	--	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	--------------	----------	--	---	---

III. 2.2	Studimi i fizibilitetit për rritjen e kapacitetit termik në Kogjenë rimin TC “Kosova B” nga 140 MWth në 280 MWth	2023	€ -	€ 1,500,000.00	€ -	€ -	IPA 2020 / Komuna e Prishtinës / Termokos	Termokos / KEK	Studimi i fizibilitetit i finalizuar.	Nëntëdhjetë e dy për qind (92%) Ky projekt është pjesë e studimit të Masterplanit për zgjerim të rrjetit dhe sigurimin e kapaciteteve shtesë të energjisë termike përmes dyfishimit të kapaciteteve gjeneruese, nga 140 në 280MWTH, nga TC “Kosova B” . Sa i përket zhvillimeve për këtë projekt, janë realizuar: 1. Në qershor të vitit 2022, është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi, në mes Bankës Evropiane për Investime (EIB), Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës dhe Termokosit, për fondin në vlerë prej 1.5 mil. € për financimin e studimeve paraprake për këtë projekt; 2. Projekti për dekarbonizim është aprovuar nga bordi i ndërmarrjes në muajin janar 2024; 3. Kompania konsulente ka prezentu dizajnin inicial për instalimin e gypave në sallën e turbinave TUH, HES1&HES2 si dhe rrjetit HES-2 HRS-2; 4. Kompania ka prezentu zonimin e ri (zonat ku duhet të zgjerohet rrjeti); 5. Është prezentu trasa e propozuar për rrjetin Termoelektrane “KosovaB”-Termokos; 6. Është definuar lokacioni për HRS-2. Objekti ekzistues “Termokos” do të destinohet për këtë çështje; 7. Është përgatitur vlerësimi financiar i projektit; 8. Është aprovuar nga EIB- “Raporti mbi Vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe social”(VNMS); 9. Është prezentu Plani për Financim të projektit, por ende nuk janë siguruar grantet dhe format tjera të financimit të projektit (për shkak të aplikimit të masave ndaj Republikës së Kosovës); 10. Është aprovuar Masterplani I ri për zgjerimin e rrjetit në kuadër të këtij projekti, ndërsa, aktivitetet e realizuara dhe në proces lidhur me këtë projekt në periudhën gjashtëmujore janar – qershor 2025, janë: 1. Kompania konsulente ka finalizuar dizajnin inicial për instalimin e gypave në sallën e turbinave TUH, HES1&HES2 si dhe rrjetit HES-2 HRS-2; 2. Është finalizuar koncept dizajni për zgjerim të rrjetit në kuadër të këtij projekti; 3. Ka vazhduar puna për plotësimin e dokumentacioneve të nevojshme për leje të ndryshme: identifikimi i parcelave përgjatë trasesë, dokumentacioni për shpronësim, pëlqim mjedisor etj.; 4. Është duke u punuar në finalizimin e dokumentacionit për
-------------	--	------	-----	----------------	-----	-----	---	----------------	---------------------------------------	---

											shpronësim/servitut për dorëzim në MMPHI; 5. Është mbajtur takimi i përbashkët me Ministrinë e Financave, të Ekonomisë, Komunës së Prishtinës, TetraTech dhe EIB, për t'i adresuar kërkesat për modalitetet e financimit; 6. Është vendosur për opsionet e tenderimit të projektit (sipas së cilës tenderi për punë do të zhvillohet me Lot1(koogjenerimi) dhe Lot2 (zgjerimi i rrjetit), ndërsa konsulenca me një Lot te veçantë , e cila do ti mbikqyrë punimet sipas Lot1 dhe Lot 2 . Lidhur me aktivitetet në vijim, do të përgaditet dosja e tenderit për punë dhe shërbime konsulente. Sqarim: Nga kapaciteti gjenerues prej 140MWTH, i cili do të realizohet me projektin për dyfishimin e kapaciteteve prodhuese të energjisë termike, 40 MWTH energji termike do të ndahen për Komunën e Obiliqit, ndërsa 100 MWTH energji termike do të mbeten për NP “Termokos” ShA.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

III. 2.3	Dyfishi mi i kapacite tit të prodhim it të kogjene rimit nga 140 MWth në 280 MWth dhe zgjerimi i rrjetit të transmis ionit.	2025	€ -	€ -	€ 12,000, 000.00	#### ####	Donatorët, /Komuna e Prishtinës/ Termokos.	Term okos / KEK	Kapacit ete termike gjeneru ese të dyfishu ara. Pritet plotësi mi i buxhetit deri në vlerën 80,000, 000 nga donator ët dhe instituci onet financia re ndërko mbëtare . Projekti pritet të përfund ojë në vitin 2027.	Strategji a e Energjis ë për periudh ën 2022- 2031, Plani Zhvilli mor i Termok os-it për periudh ën 2022- 2031	Zero për qind (0%) Nuk ka filluar realizimi i projektit. Afati i fundit për periudhën 2027- 2030 planifikohet realizimi i projektit. Buxheti:Për shkak të aplikimit të masave ndaj Republikës së Kosovës, ende nuk janë siguruar grantet dhe format tjera të financimit të projektit. Prandaj nuk ka pasur pagesa të realizuara gjatë vitit 2024 dhe 2025.
III. 2.4	Instalim i i pajisjev e matëse për konsum atorët e Termok os-it.	2023	€ 6,000, 000.00	€ 4,000,0 00.00	€ -	€ -	FMK	FMK / Term okos	Kostot dhe konsum i i kontroll uar i ngrohje s deri në 17,500 konsum atorë të Termok os-it.	Strategji a e Energjis ë për periudh ën 2022- 2031, Plani Zhvilli mor i Termok os-it për periudh ën	Nëntëdhjetë e gjashtë për qind (96%) Kontrata për këtë projekt është nënshkruar në prill 2022, në mes të MFK (Millenium Foundation-Kosova) dhe kontraktorit “ENERCO LLC” ShPK – Prishtinë dhe ka filluar së zbatuari më 27 korrik 2022. Meqenëse faza e parë e këtij projekti ka përfunduar në janar 2025, është vazhduar projekti për fazën e dytë. Faza e dytë e projektit për vitin 2025 do të financohet me fondet e Termokosit si bashkëfinancues i projektit me 1 milion dhe në këtë fazë planifikohet të përfshihen edhe 2,500 konsumatorë të ri.Termokos është duke shqyrtuar mundësinë e gjetjes së donatorëve për mbështetje financiare për zgjerimin e këtij projekti në të gjitha lagjet ku shtrihet rrjeti i Ngrohjes Qendrore

									2022-2031 (NQ), në mënyrë që të krijohet mundësia që të gjithë konsumatorët të faturohen në bazë të konsumit. Sa i përket realizimit të projektit “Prishtina Heat Save”, janë realizuar: Valvula termostatike: 79,148 copë; -Alokatorë: 58,039 copë; -Matës individual të energjisë termike: 4,654 copë; -Pompa qarkulluese: 233 copë; Valvola balancuese - 18 copë, -Njësi banesore ku janë kryer instalimet e pajisjeve matëse-19,564 njësi banesore. Punët e kryera në terren për realizimin e projektit “Prishtina Heat Save” gjatë periudhës shkurt 2025– maj 2025 janë: -Valvula termostatike: 1,516 copë; -Alokatorë: 1,895 copë; -Matës individual të energjisë termike: 452 copë; -Njësi banesore-2,095; Afati i fundit për periudhën 2022- 2027- planifikohet realizimi i projektit. Buxheti: Gjatë vitit 2022 janë paguar 9,995,798.00 € – paguar nga Qeveria Amerikane- MCC (donator). Gjatë vitit 2023 janë paguar 2,159,574.4 € -paguar nga Komuna e Prishtinës (donator) dhe Termokos(si bashkefinancues). Gjatë vitit 2024 janë paguar 316,647.00 € -paguar nga Termokossi (si bashkefinancues). Për vitin 2025 – Termokos ka ndarë ndarë buxhetin vetanak prej 1,000,000.00 €, nga të cilat gjatë periudhës janar –qershor 2025 janë paguar 212,178.00 € . Ndërsa gjatë periudhës korrik–dhjetor 2025, planifikohet të shpenzohet shuma e mbetur prej 787,822.00 € .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. 2.5	Përmirësimi i performancës së Ngrohjes Qendrore (NQ) në Gjakovë .	2023	€ 2,361,000.00	€ 823,000.00	€ -	€ -	Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Komuna e Gjakovës.	Ngrohja Qendrore (NQ) Gjako va.	Përmirësimi i performancës së Ngrohjes Qendrore (NQ) Gjako va, përmirësimi i rrjetit të ngrohjes së spitalit rajonal; lidhja e objekteve publike shpesh.	Plani Zhvillimor i Ngrohjes Qendrore (NQ) për periudhën 2022-2023	
-------------	---	------	-------------------	-----------------	--------	--------	---	---------------------------------	--	---	--

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 4

SO4: FORCIMI I BASHKËPUNIMIT RAJONAL DHE FUNKSIONIMI I TREGUT

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë		Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati				
IV.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 4: FORCIMI I BASHKËPUNIMIT RAJONAL DHE FUNKSIONIMIT TË TREGUT									
1	Integrimi i tregut me tregjet Pan - Evropiane të energjisë elektrike.	Jo në vend.		Integrimi i tregut me Shqipërinë 2023.	Anëtarësimi në zonën e tregut Pan-Evropiane					
IV.1	Objektivi specifik: Forcimi i bashkëpunimit rajonal									
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Kapaciteti i ofruar ndërkufitar/Kapaciteti nominal ndërkufitar.	Eksporti: 22-24%, Importi: 24-26%		Secili drejtim minimum 28-30%	Secili drejtim 70%					
Nr.	Veprimi	Afati i	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëhe	Produkti i	Referenca në
			Viti	Viti	Viti	Viti				

		fundi t	202 2	2023	2024	2025		qës dhe mbësht etës		doku mente	
IV.1. 1	Bashkimi me tregun një ditë-para me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX.	2023	€ -	€ 1,400,000. 00	€ -	€ -	ALPEX	ALPEX , KOSTT , ZRrE, ME	Integrimi i tregjeve me shumicë të energjisë elektrike.	Rregul lat e ALPE X	Njëqind për qind (100%) Më 31 janar 2024 ALPEX ShA ka filluar operimin në zonën tregtare të Kosovës, gjithashtu po në këtë ditë ka filluar edhe bashkimi i tregut Kosovë-Shqipëri (Market Coupling).
IV.1. 2	Bashkimi me tregun një brenda-ditës me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX.	2024	€ -		€ 1,350,000. 00	€ -	ALPEX		Integrimi i tregjeve brenda-ditës të energjisë elektrike.	Rregul lat e ALPE X	Njëqind për qind (100%) “Bashkimi i tregut brenda ditës me Shqipërinë nëpërmjet shkëmbimit të energjisë ALPEX” ka përfunduar më 12 dhjetor 2024.
IV.1. 3	Studimi i fizibilitetit mbi bashkimin e tregut rajonal/evropian (SDAC, SIDC).	2024	€ -	€ -	€ 250,000.00	€ -	Donatorët, Buxheti i Kosovës (BK).	KOSTT , ZRrE, ME	Integrimi i tregjeve me shumicë të energjisë elektrike.	Strate gjia e Energj isë për periud hën 2022- 2031	Zero për qind (0%) Në Athinë, në nëntor të vitit 2023 është nënshkruar memorandumi për bashkimin e tregjeve nga bursat, TSO dhe rregullatorët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë. Është hartuar një Analizë e dallimeve/boshllëqeve të cilat ekzistojnë në mes tri OST-ve rajonale. Ekspertët që janë angazhuar janë duke prezentuar modele të metodologjive të ndryshme të cilat mund/do të aplikohen në rastet tona.

IV.2	Objektivi specifik: Heqja e barrierave për funksionimin efektiv të tregut										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Statusi i tërheqjes së MFSh-së.	MFSh-ja ekziston		Fillon heqja e MFSh-së		MFSh-ja nuk ekziston					
2	Numri i ofertave të disponueshme për konsumatorët jostëpiakë.	1		6		> 6					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti i	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
IV.2.1	Hartimi dhe miratimi i ligjit për energjinë.	2023	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT, KEK	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Tetëdhjetë e pesë për qind (85%) Nuk ka pasur zhvillime.
IV.2.2	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për energjinë.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ERO, KOSTT	Legjislativi sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%) Pas aprovimit të Ligjit për Energji do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga Ligji.

IV.2.3	Hartimi dhe miratimi i ligjit për energjinë elektrike.	2023	€ -	€ 10,800.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Tetëdhjetë e pesë për qind (85%) Nuk ka pasur zhvillime.
IV.2.4	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për energjinë elektrike.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT, KEK	Legjislati i sekondar i miratuar	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%) Pas aprovimit të ligjit për energjinë elektrike që do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.
IV.2.5	Hartimi dhe miratimi i ligjit për rregullatorin e energjisë.	2023	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Dyzet për qind (40%) Nuk ka pasur zhvillime.
IV.2.6	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për rregullatorin e energjisë.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Legjislati i sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%) Pas aprovimit të ligjit për rregullatorin e energjisë do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.

IV.2. 7	Fillimi i studimeve mbi barrierat e tregut konkurrues të energjisë elektrike, dhe për metodën më të përshtatshme të heqjes graduale të MFSH-së.	2025	€ -	€ -	€ -	€ 50,000.00	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, ZRrE	Rritja e konkurrencës në treg.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%) Nuk ka zhvillime. Sipas PKZh 2025-2027 është planifikuar të fillon në K3 2026 dhe të përfundon në K4 2027.
IV.3	Objektivi specifik: Aftësimi në fushat e lidhura me energjinë dhe përfshirja e grave										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Numri i të diplomuarve të ri në vit që marrin diplomë akademike, ose kualifikim profesional në programe të reja në fushën e energjisë, dhe fushat e ndërlidhura	J/A		Të përcaktohet.		Të përcaktohet.					
2	përqindja e grave të punësuar në sektorin e energjisë.	9% [2021]		11%		25%					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
		Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025						

IV.3.1	Zhvillimi i programeve të reja të trajnimit teknik.	2024/2025	€ -	€ -	€ 350,000.00	€ 350,000.00	Donatorët	MCAK	Fuqi punëtore e aftë për të ardhmën e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (BRE).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Zero për qind (0%)
											Gjatë vitit 2024, MCA-K dhe Universiteti i Prishtinës (UP) nënshkruan një Marrëveshje Mirëkuptimi për zbatimin e Aktivitetit për Aftësitë në Energji për të Ardhmen. Si pjesë e këtij bashkëpunimi, UP themeloi Qendrën për Aftësi dhe Inovacion në Energji (QAIE) dhe ndau hapësirë brenda Fakultetit Teknik për funksionimin e saj MCA-K dhe UP kanë themeluar një grup të përbashkët punues për përgatitjen e kornizës ligjore dhe rregullative të kësaj qendre. Në këtë drejtim, gjatë vitit 2024 është përgatitur drafti i parë i rregullores së brendshme për funksionimin e QAIE-së. Po ashtu, Grupi Punues (GP) ka punuar në përgatitjen e Marrëveshjes për Entitetin Zbatues, e cila do të nënshkruhet ndërmjet MCA-K dhe UP-së. Kjo marrëveshje do të mundësojë zbatimin efektiv të Aktivitetit për Aftësitë në Energji për të Ardhmen. Gjatë vitit 2024, MCA-K ka shpallur tenderin dhe ka përfunduar procesin e vlerësimit dhe përzgjedhjes së kompanisë konsulente, e cila do të ofrojë asistencë teknike për zbatimin e Aktivitetit për Aftësitë në Energji për të Ardhmen. Megjithatë, me nënshkrimin e Urdhrit Ekzekutiv 14169 nga Presidenti i SHBA-ve më 20 janar 2025, ky aktivitet u paузua përkohësisht deri në një vendim të tjetër.

Zero për qind (0%)											
IV.3.2	Përgatitja e infrastrukturës gjithëpërfshirëse gjinore dhe planifikimi i politikave.	2024/2025	€ -	€ -	€ 300,000.00	€ 300,000.00	Donatorët	MCAK	njëzet e pesë përqind (25%) gra në fuqinë punëtore të sektorit të energjisë deri në vitin 2031	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Gjatë vitit 2024, në kuadër të Aktivitetit për Fuqi Punëtore Gjithëpërfshirëse në Sektorin e Energjisë, MCA-K ka shpallur thirrjen për grantet për kompanitë në sektorin e energjisë, si dhe për Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC). Qëllimi i këtyre granteve është të mbështesin ndërmarrjet dhe organizatat që promovojnë barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale në sektorin e energjisë, përmes krijimit të vendeve të punës gjithëpërfshirëse dhe zhvillimit të karrierës për gratë. Përmes investimeve në politika të barazisë gjinore, krijimit të hapësirave të përshtatshme për punë, si dhe nismave për zhvillim profesional, grantet do të kontribuojnë në ndërtimin e një infrastrukture gjithëpërfshirëse dhe në hartimin e politikave që sigurojnë pjesëmarrje të barabartë dhe një ambient pune të sigurt, të drejtë dhe mbështetës për gratë në sektorin e energjisë. Në janar të vitit 2025, MCA-K ka filluar procesin e vlerësimit të aplikacioneve për grante; megjithatë, ky proces është pauzuar pas nënshkrimit të Urdhrit Ekzekutiv 14169 nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara më 20 janar 2025, i cili pauzon përkohësisht aktivitetet e ndihmës së jashtme deri në një vendim tjetër.

IV.3. 3	Hartimi i standardeve dhe kurrikulave të reja profesionale, sipas kërkesave të tregut të punës.	2024	€ -	€ -	€ 10,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MASH T	Standardet profesionale dhe kurrikulat e reja të hartuara.		
------------	---	------	--------	--------	-----------------------	--------	-------------------------	-----------	--	--	--

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 5

SO5: MBROJTJA DHE FUQIZIMI I KONSUMATORËVE

Nr .	Objektiv at strategji ke dhe specifike , treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objekti vi i vitit të fundit 2031	Rezultati
V.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: MBROJTJA DHE FUQIZIMI I KONSUMATORËVE				
1	Numri i skemave të reja dedikuar konsumatorëve në nevojë.	J/A	2	4	.
2	Numri i programeve që mbështesin projektet e komuniteteve të energjisë në efikasitet dhe vetë konsum.	1	> 2	> 5	
V. 1	Objektivi specifik: Mbrojtja e konsumatorëve në nevojë				
	Indikator	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objekti vi i vitit të	

							fundit 2031				
1	Skema për mbështetjen e çmimeve për konsumatorët në nevojë.	Skema mbështetëse ekzistuese (e pashënjestëruar si duhet) [2021]	Themelimi i programit të ri për konsumatorët në nevojë.				Skemë e bazuar në testin e varfërisë, e lidhur me skemën e reformuar të asistencës sociale.				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar- qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
V. 1.1	Mbështetja e konsumatorëve në nevojë, përmes skemave ekzistuese të mbështetjes.	Vjetore	€ 4,500,000.00	€ 4,500,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	Ministria e Financave, Punëve dhe Transfereve (MFP T).	Skemat mbështetëse vjetore.	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2023-2025	Njëqind për qind (100%) Kjo skemë është zëvendësuar me Pilot-programin për Konsumatorë të Cenueshëm që është shpjeguar në V.1.4.
V. 1.2	Krijimi i një skeme të re mbështetëse për konsumatorët	Vjetore	€ -	€ -	€ 10,000,000.00	€ 10,000,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).		Skemat mbështetëse vjetore.	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën	Shtatëdhjetë për qind (70%) Programi për mbështetjen e konsumatorëve të cenueshëm është zbatuar në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.06/224 i datës 11.10.2024 dhe Vendimit të Ministres Nr. 60/2024 i datës 11.10.2024 mbi kushtet dhe kriteret për përfitim nga programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm, si pjesë e dokumentit. Programi për konsumatorët e

	orët në nevojë.								2023-2025	cenueshem 2024 -2025, ndërsa krijimi i një skeme të re për konsumatorë të cenueshëm do të rregullohet me Draft-Projektligjin për Ndihmë Sociale dhe Programet e Mbrojtes Sociale.	
V. 1.3	Hartimi i një programi pesë (5) vjeçar për mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë.	2023/2024	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ -	Donatorët		Hartimi dhe miratimi i programit për konsumatorët në nevojë.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Njëqind për qind (100%) Është përgatitur dhe aprovuar programi i konsumatorëve të cenueshëm për vitin 2024-2025, ndërsa sa i përket hartimit të programit pesë (5) vjeçar, kjo do të realizohet sigurisht pas aprovimit të kornizës ligjore që do të rregullon procedurat dhe kriteret për subvencionim të energjisë elektrike për konsumatorët e cenueshëm.
V. 1.4	Hartimi dhe miratimi i programit një (1) vjeçar për zbatimin e masave për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë.	2023	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA		Programi një (1) vjeçar i hartuar dhe miratuar.	Vendimi i ministrit për formimin e Grupit Punues (GP).	Njëqind për qind (100%) Programi i konsumatorëve të cenueshëm për vitin 2024-2025 ka filluar të implementohet nga muaji tetor 2024. Nga ky program kanë përfituar 90,977 familje (mars-2025). Sipas këtij programi në formë të subvencionimit të një shume të pagesës së faturës mujore për energji elektrike, kanë përfituar familjet bazuar në nivelin e të ardhurave dhe kufirit të përcaktuar të të hyrave financiare të përcaktuara në program dhe Vendimin e MFPT-së.
V. 1.5	Mbështetja përmes subvencionimit të një pjese të faturës për përfituesit e skemave	2023	€ -	€ 20,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA		Numri i familjeve në nevojë të mbështetur me subvencionim të drejtpër	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbutja e ndikimit të menjëherëshëm socio-ekonom	Është përfshirë në kuadër të Veprimit 1.4.

	sociale dhe pensionale, si dhe familjet që përzgjidhen përmes një skeme formale të testuar.								drejtë (200,000 përfitues).	ik të krizës energjetike.	
V. 1.6	Mbështetje përmes subvencionimit të metodave alternative (dru dhe pelet) për qëllime ngrohjeje për grupet e cënueshme.	2023	€ -	€ 5,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA		Numri i familjeve në nevojë që përfitojnë nga mbështetja (10,000 familje)	Masa 1. Plani i Veprimt - Zbutja e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Njëqind për qind (100%) Është finalizuar në vitin 2023, kanë përfituar rreth 20,000 familje në asistencë sociale subvencionim.

V. 1.7	Mbështetja e familjeve përmes subvencionimit të faturës së muajit aktual të energjisë elektrike, bazuar në përqindjen e kursimeve të energjisë që kanë bërë në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë.	2023	€ -	€ 15,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA	Numri i familjeve të mbështetura përmes kursimit të energjisë	Masa 1. Plani i Veprimt - Zbutja e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Njëqind për qind (100%) Ka qenë aktive mes muajve tetor 2022 - prill 2023 ku kanë përfituar rreth 300,000 familje.
V. 2	Objektivi specifik: Fuqizimi i konsumatorëve									
	Indikator	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objekti vi i vitit të fundit 2031				

1	Zbatimi i fushatave vetëdijëse, dhe informuese për energjinë .	6 [2021]	9 çdo vit				9 çdo vit				
2	Diversitet i dhe krahasueshmëria e shërbimeve të ofruara për konsumatorët.	Nuk ka oferta të disponueshme.	Lansimi i Mjetit për Krahasimin e Çmimeve.				Oferta alternative të disponueshme për të gjithë konsumatorët.				
Nr .	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar - qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
V. 2.1	Krijimi i legjislacionit për Mjetin e Krahasimit të Çmimeve , me udhëzime të detajuara mbi informacionin që do të jepet në Mjet.	2023	€ -	€ 20,000.00	€ -	€ -	Donatorët	ZRrE	Korniza ligjore mundëson zhvillimin e Mjetit të Krahasimit të Çmimeve.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

V. 2.2	Zhvillimi i Mjetit të Krahaskimit të Çmimeve	2023	€ -	€ 7,000.00	€ -	€ -	ZRrE	ZRrE	Mjeti i Krahaskimit të Çmimeve plotësisht funksionale.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pesëdhjetë për qind (50%)
V. 3	Objektivi specifik: Ruajtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit										
	Indikator	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objekti i vitit të fundit 2031					
1	Emetimet e pluhurit, NOx dhe SO ₂ të termocentraleve të linjtit.	TC “Kosova B”: Pluhuri: mbi 300 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 500 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³ TC “Kosova A”: Pluhuri: mbi 50 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 600 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³		TC “Kosova B2”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 600 mg/ Nm ³ TC “Kosova B1”: Pluhuri: mbi 300 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 500 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³ TC “Kosova A3”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 200 mg/ Nm ³ TC “Kosova A4 & A5”: Pluhuri: mbi 50 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 600 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³		TC “Kosova B”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 200 mg/ Nm ³ TC “Kosova A”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 200 mg/ Nm ³					

Nr .	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2025
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

V. 3.1	Rritja e kapaciteteve të AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.	2025	-	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).	MMP HI, Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK).	Ngritja e kapaciteteve për stafin e AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.	Udhëzimi Administrativ (UA) për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.	Përqindja nuk është relevante Gjatë periudhës kohore janar-qershor 2025, në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve për kontrollimin e ndotjes së ajrit në Kosovë” të mbështetur nga JICA, pesë (5) zyrtarë të AMMK, janë trajnuar për monitorimin, vlerësimin, verifikimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie, ku kanë mbajtur rreth dhjetë (10) takime bilaterale me karakter trajnimi. katër (4) zyrtarë nga AMMK kanë marrë pjesë në punëtorin me karakter ndërkombëtarë për inventarin e emisioneve në ajër dhe vlerësimin e modelimit të integruar (GAINS Model) të mbajtur në Vjenë të Austrisë në organizim të EU TAIEEX. Të dhënat nga emetimet nga impiantet e mëdha me djegie për vitin 2024 janë raportuar në Agjencinë e Mjedisit të Evropës në kuadër të obligimeve Energy community - Reporting on Combustion Plants (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/eu/energycommunity/envz5ixjq/). Gjithashtu të dhënat për emision nga impiantet me djegie të mëdha janë përfshirë edhe në kuadër të Raportimit për Inventarin e Emisioneve në ajër sipas kërkesave të CLRTAP (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/un/clrtap/inventories/envz6x4gw/). Të dhënat për emetimet nga Impiantet për Djegie të Mëdha janë përfshirë edhe në kuadër të Raportit për Gjendjen e Ajrit 2024 (https://ammk-rks.net/assets/cms/uploads/files/Drafti%20final%20-%20Raporti%20Vjetor%20%20pe%CC%88r%20Gjendjen%20e%20Ajrit%202024%2014.07.2025-Angl_.pdf) dhe në Draftin e Raportit për Gjendjen e Mjedisit 2024.
--------	--	------	---	------------	------------	------------	-------------------------	--	---	--	--

Fundi i dokumentit
