



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Ekonomisë
Ministarstvo Ekonomije -Ministry of Economy

**RAPORTI I PROGRESIT PËR PERIUDHËN JANAR-
QERSHOR 2024**

I

**PROGRAMIT TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË
ENERGJISË SË KOSOVËS (PZSEK)
PËR PERIUDHËN 2022-2025**

Prishtinë, gusht 2024

Përmbajtja

1.	SHKURTESAT:	3
2.	INFORMATA TË PËRGJITHSHME	4
2.1.	PROGRESI I PËRGJITHSHËM	5
2.2.	PROBLEMET DHE RREZIQET	6
2.3.	SFIDAT DHE MANGËSITË:	7
2.4.	KONKLuzionet dhe rekomandimet për hapat e ardhshëm	7
2.5.	Hapat e ardhshëm	8
3.	Informacione të detajuara për zbatimin e aktiviteteve	8
4.	Shtojca- Matrica e raportit të progresit për periudhën janar-qershor 2024	11

1 Shkurtesat:

BE	Bashkimi Evropian
BRE	Burimet e Ripërtërishme të Energjisë
BRE-E	Energjia elektrike e prodhuar nga burimet e ripërtërishme
CERT	Ekipi i komunitetit për reagim urgjent
CO ₂	Dioksidi i Karbonit
EE	Efiçienca e Energjisë
ESCO	Kompania e Shërbimit të Energjisë
VNMS	Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social
PZSE	Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë
FKEE	Fondi i Kosovës për Efiçencë të Energjisë
GS	Gazrat Serë
IPF9	Objekti i Projektit të Infrastrukturës - Asistencë Teknike 9
KEDS	Kompania Kosovare e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
KEK	Korporata Energjetike e Kosovës
KfW	Instituti i Kredive për Rindërtim
KOSTT	Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës
Ktoe	Kilo ton ekuivalent naftë
MAShT	Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
MCAK	Llogaria e Sfidës së Mijëvjeçarit-Kosovë
MCC	Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit
ME	Ministria e Ekonomisë
MFK	Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë
MFPT	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
MMPHI	Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
MW	Mega Vat
MWt	Mega Vat termik
NO _x	Oksidet e Azotit
NQ	Ngrohja Qendrore
OSSh	Operatorët e Sistemit të Shpërndarjes
OST	Operatorët e Sistemit të Transmetimit
SAIDI	Indeksi Mesatar i Kohëzgjatjes së Ndërprerjes së Sistemit
SAIFI	Indeksi i Frekuencës Mesatare të Ndërprerjeve të Sistemit
SCADA	Kontrolli Mbikëqyrës dhe Marrja e të Dhënave
SO ₂	Dioksidi i Sulfurit
ETS BE	Sistemi i Tregtimit të Emetimeve të Bashkimit Evropian
WBIF	Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor
ZRrE	Zyra e Rregullatorit për Energji

2 INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Ministria e Ekonomisë (ME), ka hartuar Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK), për periudhën 2022-2025, i cili është miratuar më 5 shtator të vitit 2023 në Qeverinë e Republikës së Kosovës (QRK).

Bazuar në nenin 7 pika 7 e Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë, Ministria e Ekonomisë (ME), ka obligim ligjor që të bëjë monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës. Prandaj ministria ka hartuar raportin gjashtë (6) mujor janar-qershor 2024, mbi progresin e realizimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, si dhe nivelin e zbatimit të Strategjisë së Energjisë për periudhën 2022-2031, i cili është në përputhje me kërkesat e Udhëzimit Administrativ (UA) të Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK) Nr. 07/2018 për Planifikimin dhe Hartimin e Dokumenteve Strategjike dhe Planeve të Veprimit.

Raporti i Progresit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë për periudhën janar-qershor 2024 është hartuar, bazuar në realizimin e aktiviteteve të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025.

Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, përfshin një listë prej pesë (5) objektivash strategjike, pesëmbëdhjetë (15) objektivash specifike dhe nëntëdhjetë (90) aktiviteteve që parashihen të realizohen për zhvillimin e sektorit të energjisë.

Raporti i progresit ka për qëllim që të evidentoj shkallën e realizimit të projekteve/aktiviteteve të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën janar-qershor 2024, si dhe të evidentohen sfidat dhe të propozohen rekomandimet për vendimmarrje nga autoritetet përkatëse.

Objektivat strategjike janë:

- Objektivi 1: Përmirësimi i besueshmërisë së sistemit;
- Objektivi 2: Dekarbonizimi dhe promovimi i energjisë së ripërtëritshme;
- Objektivi 3: Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE);
- Objektivi 4: Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe funksionimit të tregut;
- Objektivi 5: Mbrojtja dhe fuqizimi i konsumatorëve.

2.1. PROGRESI I PËRGJITHSHËM

Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025 për vitin 2024 ka paraparë gjithsej pesëdhjetë e një (51) aktivitete, por janë edhe nëntë (9) aktivitete të tjera të cilat janë bartur nga viti 2023. Nga gjithsej gjashtëdhjetë (60) aktivitetet të planifikuara të realizohen në vitin 2024 në gjashtë (6) mujorin e parë vetëm në tridhjetë e gjashtë (36) prej tyre ka pasur progres.


Objektivit 1 i PZSEK-së është realizuar tetëmbdhjetë përqind (18%) në periudhën janar-qershor 2024, objektivi 2 është realizuar tridhjetë e shtatë përqind (37%), objektivi 3 është realizuar tridhjetë e tetë përqind (38%), objektivi 4 është realizuar njëzet e tetë përqind (28%) dhe objektivi 5 është realizuar tridhjetë e tre përqind (33%).

Në vazhdim arrijtjet e realizimit të objektivave janë paraqitur në formë tabelore dhe grafike.

Tabela 1. Përqindja e realizimit të objektivave janar-qershor 2024

	janar-qershor 2024
Objektivi 1	18%
Objektivi 2	37%
Objektivi 3	38%
Objektivi 4	28%
Objektivi 5	33%
Totali i zbatimit të objektivave	30.80%

Figura1. Përqindja e realizimit të objektivave janar-qershor 2024

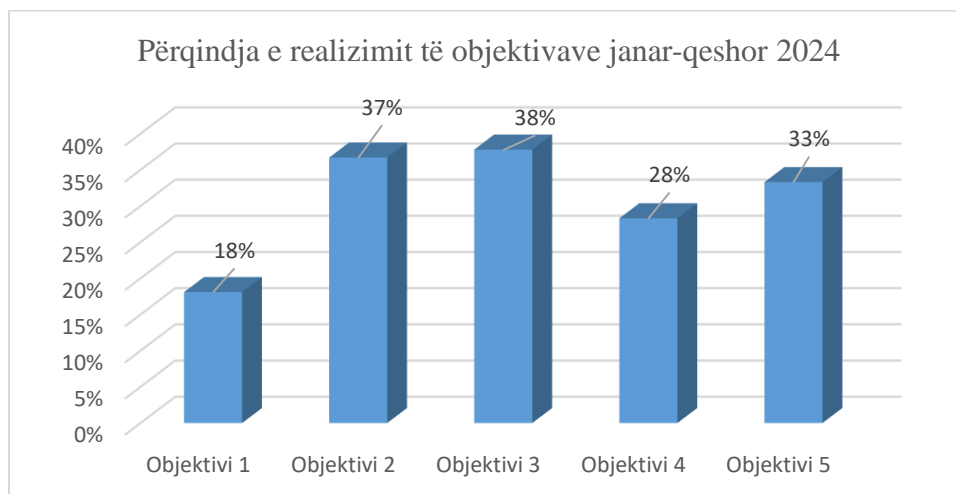


Totali i realizimit të objektivave për periudhën janar- qershor 2024 është tridhjetë pikë tetë përqind (30.8%).

Për periudhën janar-qershor 2024, vetëm tri (3) aktivitete apo pesë pikë një përqind (5.1%) janë realizuar plotësisht, pjesërisht janë realizuar gjithsej tridhjetë e një (31) aktivitete apo pesëdhjetë e një pikë shtatë përqind (51.7%), ndërsa aktivitete të cilat nuk janë realizuar janë njëzet e gjashtë (26) apo dyzet e tre pikë tre përqind (43.3%).

Në vazhdim të dhënave të mesipërme janë të paraqitura edhe në formë grafike:

Figura 2. Përqindja e realizimit të aktiviteteve për periudhën janar-qershor 2024

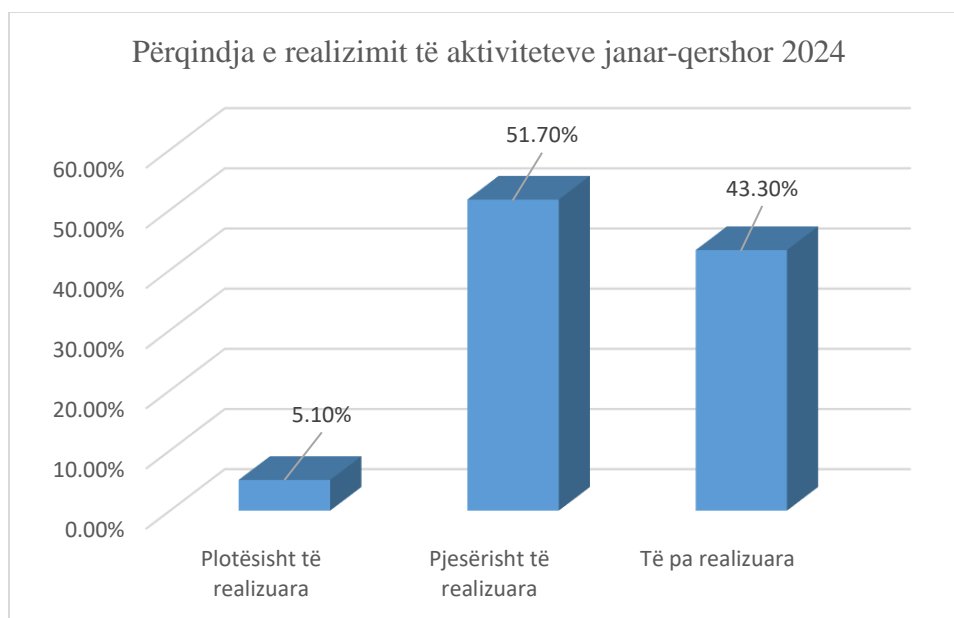

Objektivi i cili me realizueshmërin më të mirë për periudhën janar- qershor 2024 është objektivi i 3-të. Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE), ndërsa objektivi i cili ka pasur realisueshmërin më të ulët për këtë periudhë është objektivi 1 Permiresimi i Besueshmërisë së Sistemit (PBS).

2.2. PROBLEMET DHE RREZIQET

Gjatë monitorimit të zbatimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën janar-qershor 2024, janë hasur në disa rreziqe të cilat ndërlidhen me kapacitetin institucional, kapacitetin financiar, mjedisin rregullator, partneritetin dhe angazhimin e institucioneve të tjera, si dhe faktorë të tjerë të jashtëm që janë shfaqur gjatë realizimit të aktiviteteve, dhe që ndikojnë në zbatimin e dokumentit strategjik.

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, Ministria e Ekonomisë (ME), përkatësisht Departamenti i

Energjisë (DE), ka koordinuar procesin e hartimit të Raportit të Progresit me aktivitetet e parapara. Ky monitorim është bërë duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse ku janë identifikuar rreziqet të cilat do të adresohen në vitet e ardhshme me masa konkrete. Ministria e Ekonomisë (ME), do të vazhdoj bashkëpunimin dhe koordinimin me institucionet relevante dhe ndërmarrjet kryesore të sektorit të energjisë në adresimin e të gjitha rreziqeve me të cilat vazhdojnë të ballafaqohen.

Konstatimi i ngecjeve në realizimin e disa projekteve të parapara na drejton në marrjen e hapave të domosdoshëm dhe konkret në eliminimin e barrierave që pengojnë zhvillimin e sektorit të energjisë. Planifikimi i projekteve dhe aktiviteteve nga institucionet përgjegjëse për energji elektrike, është mjaft i rëndësishëm në suksesin dhe zhvillimin e sektorit të energjisë. Një rol të rëndësishëm luan edhe lehtësimi i procedurave të shumta me qëllim të mosvonesës dhe ngecjes së projekteve.

2.3. SFIDAT DHE MANGËSITË:

Sfidat, mangësitë dhe pengesat e hasura gjatë monitorimit të këtij dokumenti janë të njëta, sfida të cilat janë paraqitur edhe në monitorimin e zbatimit për vitet 2022-2023, që lidhen me kapacitetin institucional, kapacitetin financiar, mjedisin rregullator, partneritetin dhe angazhimin e institucioneve të tjera, si dhe faktorët e tjerë të jashtëm që ndikojnë në nivelin e zbatimit të dokumentit strategjik.

Gjatë realizimit të projekteve dhe aktiviteteve të parapara, institucionet përgjegjëse mund të ketë sfida, mangësi dhe pengesa varësisht nga natyra e projekteve. Disa nga sfidat të cilat janë identifikuar gjatë realizimit të disa projekteve, dhe aktiviteteve janë: mosnënshkrimi i marrëveshjeve për financim të projekteve dhe ratifikimi i tyre në Kuvendin Republikës së Kosovës. Si sfida të tjera të paraqitura janë: vonesa në marrjen e lejeve nga institucionet përkatëse për ndërtim, shpronësimi i tokave dhe ngritja e çmimeve në treg, çmimet e vjetruara të kontratave, vonesa në procese të prokurimit.

2.4. KONKLuzionet dhe Rekomandimet për Hapat e Ardhshëm

Gjatë monitorimit të Raportit të Progresit, mund të konstatohet se për periudhën janar-qershor 2024 progresi i realizimit të aktiviteteve ka qenë jo i knaqshëm, ku progresi për këtë periudhë është tridhjetë pikë tetë përqind (30.8 %).

Një ndër arsyet e pengesave të realizimit të aktiviteteve janë: mosratifikimi i marrëveshjeve financiare, planifikimi jo i duhur i afateve kohore të implementimit të aktiviteteve. Një pengesë tjetër që ka shkaktuar mos realizimin në kohë të aktiviteteve, është edhe ndërlikohja e tyre me dokumentet strategjike, programeve të cilat fillimisht është dashur të jenë të aprovuara dhe të jenë në fuqi. Si pengës tjetër janë edhe procedurat të shumta për marrjen e lejeve të ndryshme për realizimin e aktiviteteve të parapara, dhe procedurat e prokurimit. Mungesa e fuqisë punëtore të profileve specifike për shkak të mungesës së programeve arsimore.

2.5.HAPAT E ARDHSHËM

Për hapat e ardhshëm duke u bazuar në konkluzionet dhe të gjeturat nga raportimi i institucioneve, mbi zbatimin e aktiviteteve dhe masave në kuadër të objektivave strategjike janë:

- Planifikim më i mirë i afateve kohore për miratimin e kornizës ligjore;
- Lehtësimi i procedurave për marrjen e lejeve me qëllim që mos të ketë vonesa në fillimin e realizimit të projekteve;
- Shpronësimi me kohë i pronave aty ku parashihet të realizohen projektet;
- Planifikimi më i saktë i aktiviteteve dhe afateve kohore të implementimit të projekteve nga institucionet duke marrë për bazë pengesat dhe sfidat që mund t'i kenë gjatë realizimit të projekteve;
- Nënshkrimi dhe ratifikimi me kohë i marrëveshjeve financiare nga institucionet përgjegjëse;
- Të rishikohen kurikulat në nivelin e arsimit të mesëm, dhe të lartë që t'ju përshtaten profileve specifike të kërkesave për punë.

3 INFORMACIONE TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E AKTIVITETEVE

Objektivi 1: Përmirësimi i Besueshmërisë së Sistemit

Përmirësimi i besueshmërisë së sistemit, përfshin të gjitha aktivitetet që garantojnë sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe funksionimin e një sistemi elektroenergjetik stabil.

Aktivitetet e parapara dhe të cilat kanë pasur zhvillime në këtë periudhë kanë ndikuar në përmirësimin e besueshmërisë së sistemit, kjo është arritur bazuar në këto aktivitete:

- Ndërtimi i nënstacionit Fushë - Kosovë;
- Investimet kapitale në Teknologjinë Informativë (TI).
- Projektet e tensionit të mesëm 35/10(20) kV;
- Rrjeti i zgjeruar (Smart Grid).

Objektivi 2: Dekarbonizimi dhe Promovimi i Energjisë së Ripërtëritshme

Rruga drejt zvogëlimit të emetimeve të dioksidit të karbonit të sektorit do të shoqërohet me zhvillimin e kapaciteteve të mëdha të BRE-ve, bazuar në potencialin teknik dhe ekonomik të tyre.

Shumica e aktiviteteve të parapara kanë të bëjnë me fillimin e hartimit të akteve ligjore, nënligjore, planeve dhe studimeve të fizibilitetit, me qëllim të krijimit të infrastrukturës së përshtatshme për investime.

Në periudhën janar-qershor 2024, janë hartuar/draftuar këto dokumente:

- Ligji për Burime të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE);
- Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore-SolarKosovë;
- Studimi i fizibilitetit & vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social, për sistemin e Ngrohjes Qendrore (NQ) në nëntë (9) komunat e Republikës së Kosovës.

Objektivi 3: Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE)

Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE), është thelbësore për të arritur katër (4) caqet e strategjisë së energjisë: ajo përmirëson sigurinë e furnizimit me energji dhe zvogëlon varësin nga importi, zvogëlon barrën e konsumatorëve dhe zvogëlon emetimet e GS-ve dhe ndotjen e ajrit.

Në periudhën janar- qershor 2024 numri i aktiviteteve të cilat kanë pasur zhvillim në këtë periudhë, janë ndër aktivitetet të cilat kanë ndikuar në rritjen e Eficiencës së Energjisë (EE).

Këto aktivitete janë:

- Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) në Prishtinë;
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (niveli qendror);
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (në nivel komunal);
- Instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorët e “Termokosit”;
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial (shtëpi individuale);
- Studimi i fizibilitetit për rritjen e kapacitetit termik në kogjenerimin TC “Kosova B” nga 140 MWth në 280MWth.

Objektivi 4: Forcimi i Bashkëpunimit Rajonal dhe Funkcionimit të Tregut

Republika e Kosovës, është e zotuar që të zbatojë të gjitha obligimet e Traktatit të Komunitetit të Energjisë (TKE) për krijimin e një tregu energjetik të lirë, të integruar dhe konkurrues.

Në periudhën janar-qershor 2024 numri i aktiviteteve të cilat kanë pasur zhvillim në këtë periudhë, janë ndër aktivitete të cilat kanë ndikuar në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe funksionimin e tregut. Këto aktivitete kanë të bëjë me:

- Bashkimi me tregun një ditë para me Shqipërinë përmes bursës së energjisë Alpex;
- Bashkimi me tregun një brenda -ditës me Shqipërinë përmes bursës së energjisë Alpex;
- Hartimi i draftligjit për energjinë elektrike;
- Hartimi i draftligjit për energjinë;
- Hartimi i draftligjit për Zyren e Rregullatorit të Energjisë.

Objektivi 5: Mbrojtja dhe Fuqizimi i Konsumatorëve

Strategjia e energjisë vendos njerëzit në qendër të saj dhe vendos objektivat në këto fusha, andaj për këtë qëllim janë paraparë disa aktivitetet në Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025.

Në periudhën janar-qershor 2024 janë paraparë disa aktivitetet për tu realizuar, por në këtë periudhë vetëm një aktivitet ka pasur zhvillime të kënaqshme. Ky aktivitet ka të bëjë me:

- Hartimi dhe miratimi i programit një (1) vjeçar për zbatimin e masave për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë.

4 SHTOJCA- MATRICA E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2024

MBIKQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

SO1: PËRMIRËSIMI I BESUESHMËRISË SË SISTEMIT

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet.	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati						
I.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 1: PËRMIRËSIMI I BESUESHMËRISË SË SISTEMIT										
1	Indikatori: Indeksi mesatar i kohëzgjatjes së ndërprerjes së sistemit (SAIDI).	SAIDI: 80.83 orë/vit (2021)	SAIDI: 63 orë/vit	SAIDI: 51.84 orë/vit							
2	Indikatori: Indeksi mesatar i frekuencës së ndërprerjeve të sistemit (SAIFI).	SAIFI: 58.27 (2021)	SAIFI: 49	SAIFI: 40.86							
I.1	Objektivi specifik: Rritja e fleksibilitetit të sistemit										
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031							
1	Niveli i kapacitetit rregullues fleksibil.	5 MW (2022)	5 MW	170 MW							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

I.1. 1	Përgatitja e parafizibilitetit, fizibilitetit dhe projekteve teknike për sistemin e ruajtjes së baterive.	2025	€ -	\$ 1,180,837.00	\$ 3,078,637.00	\$ 242,079.00	Donatorë	MCC, ME KOSTT	Dokumentacioni teknik i përgatitur.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Konsulenti për Dizajn dhe Mbikqyrje për sistemin e ruajtjes së energjisë me bateri (BESS), është kontraktuar dhe ka filluar punën në nëntor 2023. Aktualisht ka filluar puna për dizajnin bazë të BESS, duke përfshirë sistemin e baterive dhe kyçjen në rrjetin e transmissioinit, si dhe përgaditjen e pakos tenderuese për ndërtimin e BESS. Konsulenti ka përfunduar analizat gjeoteknike të lokacionit ku do të ndërtohet sistemi i baterive për nevoja të KOSTT. Gjithashtu është lansuar kërkesa për informata të tregut të kompanive për ndërtimin e baterive, dhe është përgatitur raporti për hulumtimin e tregut mbi teknologjitë dhe parametrat më të fundit të BESS. Se fundi është hartuar dizajni
-----------	---	------	--------	--------------------	---------------------------	------------------	----------	---------------------	-------------------------------------	--	--

I.1. 2	Mbështetje teknike dhe ligjore për integrimin e baterive - Projekti i MCC	2025	€ -	\$ 1,916,000.00	\$ 2,034,667.00	\$ 2,045,667.00	Donatorët	MCC, ME KOSTT	Dokumentacioni teknik i përgatitur.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Konsulent Mbështetës për sistemin e ruajtjes së energjisë me bateri (BESS) janë kontraktuar në maj të vitit 2023 të cilët janë angazhuar në hartimin dhe plotësimin e kornizës ligjore për të mundësuar kyçjen e baterive në rrjet, si dhe analizën e opsioneve për pronësinë e baterive për KOSTT. Këta dy (2) konsulentë kanë dhënë mbështetje të përgjithshme, për përgatitjen e dokumentacionit për krijimin e ndërmarrjes së re publike. Korporata e Ruajtjes së Energjisë ShA, me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK), si dhe mbështetje për plotësimin e kushteve pararendese. Kjo mbështetje ka vazhuar përgjatë vitit 2024. Sa i përket funksionalizimit
-----------	---	------	--------	--------------------	---------------------------	--------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--	---

											<p>të ndërmarrjes së re publike, pas krijimit të ndërmarrjes me vendim të Qeverisë Republikës së Kosovës (QRK) më 13 mars 2024, është miratuar përfshirja në plan të prokurimit të MCA-Kosovë për konsulencë për rekrutim të stafit të ndërmarrjes si dhe konsulencës për asistencë teknike, e cila do të mbështes ndërmarrjen në hartimin e planit të biznesit, rregulloreve teknike për operim të baterive, politikave të qeverisjes korporative dhe financiare etj. Termet e referencës për këto dy konsulencë janë duke u hartuar.</p>
I.1.3	Master Plani i Zhvillimit të Gazit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor (VNM)	2023	€ 750,000.00	€ 750,000.00	€ -	€ -	WBIF / IPF9	ME, MMPHI, MINT	Masterplani i Gazit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor i Finalizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	-Ka përfunduar.

I.1.4	Studimi i fizibilitetit për Gazsjellësin e Interkoneksionit të Maqedonisë Veriore – Kosovë.	2023	€ 325,000.00	€ 325,000.00	€ -	€ -	WBIF/IPF 9	ME, MMPHI, MINT	Studimi i fizibilitetit i finalizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka përfunduar.
I.1.5	Studim për identifikimin e potencialit të energjisë gjeotermale në Kosovë.	2025				€ 750,000.00	Donatorët	ME	Studimi i fizibilitetit i realizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar ende.
I.2	Objektivi specifik: Modernizimi i rrjeteve dhe reduktimi i humbjeve në rrjet										
	Indikatori		Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Humbjet në shpërndarje		18.48% [2021]		13.3 %		9%				
2	Sasia e kapacitetit variabil të BRE-ve, që rrjeti është në gjendje të tajtojë/integrojë		147 MW [2021]		500 MW		2000 MW				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.2.1	Zhvillimi i sistemit (SCADA & Telekomunikacion).	Vjetrore	€ -	€ 5,684,923.33	€ 4,063,814.93	€ 1,863,702.50	KOSTT	KOSTT	Kërkesat e ENTSO-E janë plotësuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Projektet janë bartë në grupin e projekteve për financim me KfW faza e VII, dhe do të realizohen si paket i projekteve të ndara në LOT1, LOT2, LOT 3 dhe LOT 4 . Projekti ka vonesat, për shkak të vonesës
I.2.2	Përforcimi dhe rehabilitimi i rrjetit ekzistues të energjisë (OST)	Vjetrore	€ 2,400,000.00	€ 2,260,000.00	€ 1,063,542.37	€ 1,354,203.39	KOSTT	KOSTT	Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së rrjetit	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

I.2. 3	Ndërtimi i kapaciteteve të reja të transmetimit dhe kapaciteteve transformuese - Reaktori shunt-variabël (100 MWA).	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ -	€ 3,449,152.54	KOSTT	KOSTT	Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së rrjetit. Plotësimi i kërkesave të Kodit të Rrjetit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	se ratifikimit të marrëveshjes me KFW. Realizimi financiar 0€. Është filluar faza e përzgjedhjes së Kompanisë konsulente e cila do të përgaditë Specifikimet teknike dhe tender dosje.
I.2. 4	Mbështetja e ngarkesës/ Nyjet e reja 110/10 (20) kV (OST & OSSH) (SS Katrioti - Ferizaj 3 dhe TS Malisheva" (SS Katrioti - Ferizaj 3 and TS Malisheva.	Vjetrore	€ 3,000,000.00	€ 5,061,277.00	€ 10,094,931.52	€ -	KOSTT	KOSTT	Reduktimi i humbjeve të energjisë dhe fuqisë së pashërbyer.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	1. Projekti „NS Ferizaj 3 - Kastriot ka përfunduar në qershor të vitit 2023, me kohë dhe sipas buxhetit por nuk është energjizuar dyzet përqind (40%). Energjizimi i nënstacionit është i ndërlidhur me Projektin “Ndërtimi i linjës/kabllos 110kV për kyçje të nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV Ferizaj 3 - Kastriot”, e procesi i ndërtimit të linjës është vonuar, për shkak të pezullimit nga MMPHI, si rezultat i disa ankesave në gjykatë nga pronarët e tokave

									<p>shtatëdhjetë e pesë përqind (75%).</p> <p>2. Projekti “Ndërtimi i NS Fushë – Kosovë” gjatë gjashtë (6) mujorit të vitit 2024 ka përfunduar sipas planit dhe buxhetit. Projekti është i ndërlidhur me projektin “Furnizimi dhe instalimi i transformatorit 40MVA në NS Fushë - Kosovë” i cili pritet të përfundoj në maj të vitit 2025. Energjizimi i NS pritet në vitin 2025 shtatëdhjetë e pesë përqind (75%).</p> <p>3. Konform ligjit për projektin NS Malisheva është duke u përgaditur dokumentacioni - dizajni për aplikim për marrjen e lejeve të ndërtimit. Projekti i Dizajnit tetëdhjetë e pesë përqind (85%). Pas përfundimit final të dizajnit pritet tenderimi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											për ndërtimin e nënstationit.
I.2.5	Projektet e Tensionit të Mesëm 35/10(20) kV	Vjetore	€ 9,247,735.33	€ 13,216,444.00	€ 8,800,613.00	€ 7,232,203.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	Realizimi i projekteve të TM, kryesisht fokusohet në Distriktet e: Gjakovës, Mitrovicës, Prishtinës, Ferizajit , Gjilanit , Pejës dhe Prizrenit në vlerë 3,286,949.0334 €
I.2.6	Projektet e Tensionit të Vogël 0.4 kV	Vjetore	€ 6,086,381.41	€ 7,025,149.00	€ 13,795,229.00	€ 9,677,563.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv I Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	- Realizimi I projekteve të TU kryesisht fokusohet ne Distriktet e: Gjakovës, Mitrovicës, Prishtinës, Ferizajit, Gjilanit, Pejës dhe Prizrenit në vlerë 3,638,636.5941 €

"I.2. 7	Rrjeti i zgjuar (Smart Grid)	Vjeto re	€ 14,513.93	€ 2,413,843. 29	€ 3,444,527.6 4	€ 1,765,071. 00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	1,123,994.73 € Menaxhimi i sistemit elektroenergetik shpërndarës, mirëmbajtja e tij, kontrollimi dhe monitorimi janë sfidat kryesore të kompanive të cilat operojnë me këtë sistem. Çdo herë në nënstationet elektrike janë të nevojshme të bëhen matje, mbikëqyrje, kontrollat, operime dhe funksione mbrojtëse me qëllim të përmirësimit dhe rritjes së besueshmërisë së furnizimit me energji elektrike. Integrimi i sistemeve të automatizimit, ndryshimet në rrjetin ekzistues elektrik, instalimi i pajisjeve të reja, përdorimi i makinerive janë vetëm disa prej investimeve të parapara në vitin 2024
------------	------------------------------	-------------	----------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	------	------	--	---	---

I.2.8	Instalimi i njehësorëve.	Vjetrore	€ 1,612,032.60	€ 4,000,015.00	€ 2,494,035.00	€ 2,111,940.00	KEDS	KEDS	Reduktimi i humbjeve komerciale për periudhën 2022-2025 parashikohet të instaloen rreth 121,782 njehsorë të rinjë - lidhjet e reja, ndërsa parashikohet të ndërrohen rreth 86,578 njehsorë.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	1,844,897 € -Në TM1 janë ndërruar rreth 2,100 njehësor, Në TM2 janë ndërrua rreth 6844 njehsorë.
I.2.9	Investimet kapitale në teknologjinë informative.	Vjetrore	€ 896,096.30	€ 1,544,650.00	€ 2,147,700.00	€ 1,331,800.00	KEDS	KEDS	Funksionimi i sigurtë i OSSH-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	1,063,982.84 € - Projektet e teknologjisë informatike janë investime me rëndësi të lartë për OSSH-në, të cilat përdoren në fushat e vazhdimësisë së biznesit (business continuity), efikasitetit, dhe komunikimit.
I.3	Objektivi specifik: Rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese të prodhimit të energjisë elektrike										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Numri i njësive të rinovuara të linjtit.	0 [2021]		2		3 ose 4					

2	Numri i njësive të mbyllura të linjtit.	0 [2021]		0		1 ose 2					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.3.1	Rehabilitimi i njësisë "Kosova B1"	2024	€ -	€ 7,500,000.00	€ 88,000,000.00	€ -	KEK: € 49.5 milion Granti nga BE: € 38.5 milion (Elektrofiltrat & De-Nox).	KEK, ME, ZRRë	Reduktimi i emetimit të pluhurit, NOx dhe SO ₂ Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 600 mg/ Nm	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Strategjia Zhvillimore e KEK-ut për periudhën 2021-2025	Projekti i DeNOx-it dhe i Filtrave Elektrostatik (elektrofiltrat) është shtyrë për vitet 2025 për njësinë B2 dhe 2026 për njësinë B1. Për shkak të këtij spostimi janë shtuar gjithashtu edhe projektet të cilat KEK/TCB i ka planifikuar që ti implementoi në këtë periudhë kohore të DeNOx-it dhe filtrave elektrostatik. Kjo do të thotë se nuk ka ndonjë progres në implementim të projekteve në periudhën janar – qershor 2024.

I.3.2	Rehabilitimi i njësisë "Kosova B2"	2025	€ -	€ 7,500,000.00	€ -	€ 88,000,000.00	KEK - €49.5 milion EU Grant - € 38.5 milion (Electrofilter & De-Nox)	KEK, ME, ZRRë			Projekti i DeNOx-it dhe i Filtrave Elektrostatik (elektrofiltrat) është spostuar për vitet 2025 për njësinë B2 dhe 2026 për njësinë B1. Për shkak të këtij spostimi janë spostuar gjithashtu edhe projektet të cilat KEK/TCB i ka planifikuar që ti implementoi në këtë periudhë kohore të DeNOx-it dhe filtrave elektrostatik. Kjo do të thotë se nuk ka ndonjë progres në implementim të projekteve në periudhën janar – qershor 2024.
I.3.3	Rehabilitimi i një njësie të "Kosova A"	2024	-	€ 15,000,000.00	€ 105,000,000.00	€ -	KEK	KEK, ME, ZRRë	Rritja e kapacitetit nga 130 MW në 180 MW.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Specifikimi teknik është përfunduar dhe është dorëzuar pran Menaxhmentit të Lartë dhe Bordit.
I.3.4	Makineri, shirita transportues, shpronësime dhe investime të tjera në shpronësimin e minierave.	2024	€ 3,800,000.00	€ 48,200,000.00	€ 28,340,000.00	€ 28,340,000.00	KEK	KEK, ME, ZRRë	Investimet në minierë	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nga njësitë inicuese të gjitha kërkesat që kanë arritur në DIP, janë proceduar për trajtim të metutjeshëm në DF dhe ZEP.
I.4	Objektivi specifik: Garantimi i sigurisë kibernetike të sektorit të energjisë										

	Indikator	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031							
1	Aftësitë e reagimit kibernetik.	Nuk ekziston	Ekzistojnë	Ekzistojnë							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.4.1	Miratimi i ligjit për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	2022	€ 120,000.00	€ -	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MPB, ME,	Ligji i adoptuar	Raporti i Performancës Vjetore	Ka përfunduar.
I.4.2	Miratimi i akteve nënligjore që rrjedhin nga ligji për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	2023	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MPB, ME, ZRrE, KOSTT	Legjislacioni sekondar i aprovuar.	Ligji për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	Nuk ka progress.
I.4.3	Themelimi i Ekipit Sektorial të Energjisë për Reagim ndaj Emergjencave Kompjuterike (eCERT) në Kosovë.	2025	€ -	€ 252,250.00	€ 300,000.00	€ 50,000.00	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, CERTi nacional, MPB, ZRrE, KOSTT, KEK, KEDS	Ekipi Sektorial i Energjisë për Reagim Emergjent (eCERT) në Kosovë i themeluar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Janë përfunduar termat e referencës dhe specifikacionet teknike për projektin e themelimit të CERT-it sektorial të energjisë. Pritet që Ministria e Ekonomisë (ME) të shpallë procesin e tenderimit për themelimin e këtij CERT-i.

MBIKQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 2

SO2: DEKARBONIZIMI DHE PROMOVIMI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati
II.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 2: DEKARBONIZIMI DHE PROMOVIMI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME				
1	Reduktimi i emetimit të GS në sektorin e energjisë elektrike krahasuar me vitin 2019.	0% [2019] (6316 ktCO2)	0%	-32%	
2	Pjesëmarrja e burimeve të ripërtëritshme në konsumin e sektorit të energjisë elektrike (BRE).	6.3% [2021]	Minimum 13%	Minimum 35%	
II.1	Objektivi specifik: Zbatimi gradual i çmimit të karbonit				
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	

1	Futja graduale e çmimit të karbonit.		Nuk është prezantuar [2021]		Ka përfunduar përgatitja për një sistem të caktimit të çmimit të karbonit.		Integrimi në STE në e BE-së				
Nr.	Veprimi	Afat i i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
II.1.1	Hartimi i Strategjisë Afatgjate të dekarbonizimit.	2024	€ -	€ 37,228.13	€ 32,228.13	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI	Strategjia e draftuar dhe aprovuar.	Draftligji për Ndryshim e Klimatike	Nuk ka progres.
II.1.2	Transpozimi dhe zbatimi i MRR (BE) 2018/2066, AVR (EU) 2018/2067, dhe rregulloreve AR (KE) 765/2008	2025	€ -	€ -	€ 26,296.00	€ 26,296.00	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI	Rregullorja e transpozuar lidhur me monitorimin , raportimin dhe verifikimin.	Draftligji për Ndryshim e Klimatike	Nuk ka progres.
II.1.3	Ngritja e infrastrukturës mbështetëse dhe sistemit të qeverisjes.	2025	€ -	€ -	€ 13,000.00	€ 13,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, MMPHI	Funksionalizimi i sistemit të qeverisjes për monitorimin , raportimin dhe verifikimin e emetimeve të karbonit.	Draftligji për Ndryshim e Klimatike	Nuk ka progres.
II.1.4	Studimi i ndikimit të çmimit të karbonit.	2024 - 2025	€ -	€ -	€ -	€ 600,000.00	FMN	MMPHI	Studimi i përfunduar.		Nuk ka filluar ende.
II.2	Objektivi specifik: Promovimi i energjisë së ripërtëritshme në konsumin e energjisë elektrike										

	Indikator	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031							
1	Kapacitetet totale të ripërtëritsh me në sektorin e energjisë elektrike (përfshirë prodhuesit vetëkonsumues).	279 MW [2021]	490 MW	1600 MW							
2	Kapaciteti i prodhuesve vetëkonsumues (prosumatorët).	2 MW (2021)	30 MW	Minimum 100 MW							
Nr.	Veprimi	Afat i i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
II.2.1	Hartimi i ligjit për Burimet e Ripërtëritsh me të Energjisë (BRE).	2023	€ 12,000.00	€ 2,000.00	€ -	€ -	ME, Donatorët	ME	Ligji për BRE-të i hartuar dhe i aprovuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ligji Nr. 08/L-258 për Promovimin e Përdorimit të BRE-ve është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare (GZ), më datë: 02.05.2024.
II.2.2	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me ligjin për Burimet e Ripërtëritsh me të Energjisë	2024	€ -	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ -	ME, Donatorët	ME, ZRrE	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas miratimit të Ligjit Nr. 08/L-258 për Promovimin e Përdorimit të BRE-ve, dhe pas miratimit të Planit legjislativ të ME-së, janë caktuar zyrtarët përgjegjës për secilin nga nëntë (9) draft -aktet nënligjore.

	(BRE).											
II.2.3	Hartimi i legjislacionit sekondar për prosumatorët.	2023	€ 6,000.00	€ -	€ -	€ -	Donatorët	ZRrE	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Rregulla për prosumatorët.		Ka përfunduar.
II.2.4	Finalizimi i metodologjisë së taksës së kyçjes së OSSh-së.	2023	€ 20,000.00	€ -	€ -	€ -	ZRrE	ERO, OSSh	Integrimi i rrjetit.	Kodi i rrjetit.		Ka përfunduar.
II.2.5	Hartimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë për periudhën 2025-2030	2024		€ 30,000.00	€ 10,000.00	€ -	GIZ	ME, MMPHI	PKEK i finalizuar dhe aprovuar	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031		Ka përfunduar diskutimi paraprak i dokumentit, është në fazën e trajtimit të komenteve dhe pritjet të dërgohet në diskutim publik.
II.2.6	Njoftimi për pilot-ankandin e parë.	2023	€ 4,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Organizimi i ankandeve konkurruese për të rritur pjesëmarrjen e BRE-ve duke filluar me 100 MW	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031		Ka përfunduar.
II.2.7	Dhënia dhe kontraktimi i ankandit të parë pilot.	2023	€ -	€ 4,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE		Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031		Ka përfunduar.

II.2. 8	Ndërtimi i kapaciteteve prej 100 MW	2025	€ -	€ -	€ 75,000,000.00	€ -	Investime private	ME, ZRrE	Ndërtimi i centralit solar FV 100 MW	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Organizimi i një (1) ankandi konkurrues për të rritur pjesëmarrjen e BRE-ve duke filluar me 100 MW fotovoltaike. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave ka qenë 31 janar 2024. Më 3 shkurt 2024 është bërë hapja e ofertave nga Komisioni. Janë pranuar gjithsej gjashtë (6) oferta të cilat janë shqyrtuar nga Komisioni për vlerësimin e ofertave, ku pesë (5) ofertues kanë dalë të përgjegjshëm dhe më datë: 29.03.2024 është organizuar ankandi publik dhe është shpallur fituesi i ankandit të parë solar fotovoltaike (FV) 100 MW. Më datë: 31.05.2024 është nënshkruar marrëveshja për zhvillimin e projektit dhe marrëveshjet tjera në bazë të dosjes së tenderit. Ofertuesi që ka lidhur marrëveshjet e projektit, brenda një (1) viti nga data e lidhjes së Marrëveshjeve të Projektit, do të bëjë përmbylljen financiare dhe, brenda dy (2) viteve nga data e lidhjes së Marrëveshjeve të projektit, do ta lëshojë në punë centralin solar FV.
II.2. 9	Themelimi i njësisë për zhvillimin e kapaciteteve të BRE-ve.	2024	€ -	€ -	€ 36,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME	Njësi për zhvillimin e kapaciteteve nga BRE-të e themeluar	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Themelimi i njësisë është bërë me miratimin e rregullores së brendshme të ME-së, në mars të vitit 2023. Në shkurt të 2024-ës, është bartë në njësi zyrtarja nga Departamenti i Energjisë (DE), si zëvendësuese e Divizionit për mbështetje administrative

II.2.10	Ndërtimi i centralit diellor 100 MW në KEK	2025	€ -	€ 500,000.00	€ 65,000,000.00	€ 40,000,000.00	10,000,000 € KEK Donacion nga KfW, EIB	KEK	Ndërtimi i centralit diellor 100 MW, që pritet të funksionalizohet në vitin 2025	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Strategjia Zhvillimore e KEK-ut për periudhën 2021-2025	Në proces të përfshirjes së projektit në PZhK – Komuna Fushë – Kosovë, dhe në Harta Zonale – Komuna Obiliq. Në përfundim procesi i përzgjedhjes së Konsulentit Implementues për përgatitjen e dosjes së tenderit për implementimin e projektit. Është nënshkruar marrëveshja e kredisë me EIB në mes Ministrisë së Financave - KEK - EIB në mars 2024. Është ratifikuar marrëveshja e kredisë me KfW në Kuvendin e Republikës së Kosovës në qershor 2024.
II.2.11	Studimi i fizibilitetit për identifikimin e tokave publike të përshtatshme për FV dhe erë (faza e tretë).	2023	€ -	€ 299,000.00	€ -	€ -	Komisioni Evropian	ME, MMPHI	Vlerësimi i lokacioneve të përshtatshme të BRE-ve në pronësi publike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres.

II.2. 12	Puna përgatitore për fillimin e ankandit të dytë specifik teknologjik.	2023 - 2024	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ -	ME, Donatorët	ME	Hartimi i dosjes së tenderit dhe shpallja e ankandit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK), me përkrahje të Korporatës Financiare Ndërkombëtare – IFC si këshilltar kryesor i transaksionit, si dhe me përkrahje të USAID-it, planifikohen që gjatë vitit 2024 të filloj me lansimin e projekteve të reja konkurruese për ndërtimin e kapaciteteve të energjisë së erës prej 150 MW. Projekti i parë pritet të shpallet gjatë këtij viti, ndërsa projekti i dytë pritet të publikohet në vitin në vijim. Secili nga projektet parashihet të ketë kapacitet rreth 75 MW, por që mund të jetë më i ulët dhe më i lartë, varësisht nga konkurrenca dhe niveli i kapaciteteve të ofruara. Dokumentacioni i tenderit, si dhe skema do të përgatiten për gjatë muajve në vijim, do t'i propozohen dhe do të trajtohen në kuadër të Komitetit për Partneritet Publiko-Privat (PPP). Ndërtimi i kapaciteteve prej 150 MW të erës do të jetë i ndarë në dy (2) procese të konkurrueshme dhe do të ofrojë marrëveshje për blerjen e energjisë për së paku pesëmbëdhjetë (15) vite. Në këtë mënyrë synohet që të sigurohet konkurrencë, e në të njëjtën kohë të mundësohet shfrytëzimi i të dhënave ekzistuese të besueshme, sa i përket matjeve të erës, për të optimizuar dhe përzgjedhur lokacionet për realizueshmërinë e projekteve. Projektet planifikohen të përfshijnë edhe komponenten e Partneritetit Publik-Privat (PPP), që do të realizohet për herë të parë në një
-------------	--	-------------------	---------------	----------------------	--------	------------------	----	---	--	--

											<p>projekt i tillë në rajon. Ministria e Ekonomisë më datë: 23.04.2024, ka bërë kërkesë në ZRRë, për të vlerësuar arritjen e caqeve të BRE-ve, dhe objektivave të strategjisë përmes procedurave të autorizimeve dhe pas kësaj, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRë) më datë: 31.05.2024, ka marr vendim që projektit të ankandit të erës me kapacitet 150 MW nuk do t'i aplikohet procedurë e autoizimit dhe do të realizohet në pajtim me Ligjin për Partneritetin Publiko - Privat (PPP).</p>
II.2. 13	Mbështetje për kapacitetet gjeneruese të erës, përfshirë përgatitjen teknike të projekteve specifike.	2025	€ -	€ 500,000.0 0	€ 1,000,000. 00	€ 500,000.0 0	Donatorët	Donatorët	Studimet teknike, pajisjet matëse të erës dhe asistencë tjera teknike përkatëse.	Strategjia e Energjisë 2022- 2031	Nuk ka progres.
II.2. 14	Promovimi dhe lehtësimi i integritit të Burimeve të Ripërtëritsh me të Energjisë (BRE), dhe praktikave të Eficiencës së Energjisë (EE).	2026		€ 264,100.0 0	€ 2,413,100. 00	€ 1,715,300. 00	Lux Dev	ME, FKEE, MMPHI	Zbatimi i masave të EE & BRE, asistimi në hartimin e kornizës rregullative për EE & BRE, dhe sigurimi i časjes në mekanizmat financuese për BRE-të dhe EE-së,	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022- 2031	Në nëntor të vitit 2023 është nënshkruar Marrëveshja Bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukës së Madh të Luksemburgut lidhur me projektin e Bashkëpunimit për Zhvillim "KSV/024: Tranzicioni Energjetik dhe Zbutja e Klimës në Kosovë". Ky projekt zbatohet nga Lux Dev. Në periudhën janar-prill 2024 është bërë rekrutimi i stafit. Projekti ka paraparë periudhën prej katër (4) deri gjashtë (6) muaj si fazë fillestare për të dizajnuar aktivitetet në formën e tyre finale. Më datë 18 qershor është mbajtur

										në shkallë të vogël.		takimi i Komitetit drejtues, ku është aprovuar Plani i Punës i projektit “KSV/024: Tranzicioni Energjetik dhe Zbutja e Klimës në Kosovë”. Projekti ka filluar me rishikimin e kornizës ligjore për Eficiencë të Energjisë (EE) dhe Burime të Ripërtërishme të Energjisë (BRE).
II.3 Objektivi specifik: Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të energjisë së ripërtërishme për ngrohje												
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031						
1	Kapaciteti i instaluar i BRE-ve në sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ).	15 MWth		Minimum 65 MWth		Të përcaktohet nga Studimi i Fizibiliteti						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024	
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025						
II.3.1	Studimi i fizibilitetit & Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social (VNMS) për sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) në nëntë (9) komuna të Kosovës:	2023	€ 1,000,000.00	€ 1,350,000.00	€ -	€ -	WBIF/IPF 10	ME, MMPHI, Komunitat, MFPT	Studimi i fizibilitetit dhe VNMS janë përfunduar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Më 30 maj 2024 është mbajtur takimi i 5-të i Komitetit Drejtues ku kanë marrë pjesë edhe palët tjera të interesit. Në këtë takim është prezantuar puna finale e konsulencës lidhur me studimin ku janë zhvilluar edhe diskutime. Jemi në pritje të pranimit të studimit të finalizuar me përkthimet që kërkohen sipas termave të referencës.	

	Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pejë, Drenas, Obilq, Mitrovicë Veriore dhe Jugore & Zveçan.										
II.3. 2	Solar4Kosovo – Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore.	2024	€ -	€ -	€ 1,000,000. 00	€ -	KfW, EBRD	Termokos	Studimi i fizibilitetit ka përfunduar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022- 2031 Plani Zhvillimor i Termokos -it për periudhën 2022- 2031	<p>Ka përfunduar sa i përket zhvillimeve për këtë projekt, kanë përfunduar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Studimi i fizibilitetit; - Projekti VNMS (Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social), i punuar nga CES-iC dhe financuar nga KfW; - Është definuar dhe aprovuar lokacioni në zonën Hade e Re prej 25 ha tokë, për vendosjen e paneleve solare dhe rezervuarit të energjisë ngrohëse; - Është përzgjedhë kompania konsulente për projektin, kompania iC –CES Consulente nga Viena. <p>Ndërsa, aktivitetet e realizuara dhe në proces lidhur me këtë projekt në periudhën gjashtë (6) mujore janar – qershor 2024 janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Është nënshkruar kontrata me kompaninë konsulente për projektin, kompania iC –CES Consulente nga Viena, në muajin janar 2024; • Është duke u përgaditur dizajni për projekt dhe Masterplani për zgjerimin e rrjetit në kuadër të këtij projekti; • Është duke u përgaditur dokumentacioni tenderues (termave të referencës) për

											<p>përzgjedhjen e kompanive punëkryese. Publikimi i tenderit për zgjedhjen e punëkryesit, planifikohet të bëhet në muajin dhjetor 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka vazhduar puna për sigurimin e lejeve dhe pëlqimeve për punët që kanë të bëjnë me analizim të terrenit (shpimet për analiza gjeomekanike), ndikimin e linjës 110kV në parkun e solareve, rrjetin e ujësjellësit në lagjen Arbëria etj.
II.3.3	Ndërtimi i projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore – Solar4Kosovë.	2027	€ -	€ 45,520,162.00	€ 36,000,000.00	KfW, EBRD, WBIF, Kontributi Kombëtar.	Termokos	Energji shtesë 50 MWth nga energjia diellore për Termokosin, duke përfutur deri në 12,000 familje.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokos-it për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar ende realizimi i projektit.	

MBIKQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 3

SO3: RRRITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGIJISË (EE)

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati
III.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: RRRITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGIJISË (EE)				
1	Indikatori: Niveli i konsumit final të energjisë.	1516 ktoe [2017]	1709 ktoe	1877 ktoe	
2	Indikatori: Kursimet kumulative të energjisë të arritura në sektorin e ndërtimit.	2.7 ktoe [2021]	17.76 ktoe	266.4 ktoe	
III.1	Objektivi specifik: Përmirësimi i Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa				
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	
1	Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesa publike.	2.6 ktoe [2021]	3.3 ktoe	33.9 ktoe	

2	Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesat rezidenciale dhe komerciale .	0.1 ktoe [2021]	14.46 ktoe	232.5 ktoe							
3	Numri i ndërtesave me konsum të energjisë afër zero.	0	10	150	Improving the energy efficiency of new public buildings.						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
III.1.1	Rishikimi i ligjit për Efiçiençë të Energjisë (EE).	2023	€ -	€ 10,800.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, MMPHI , FKEE	Miratohet ligji për Efiçiençë të Energjisë (EE).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është pranuar drafti i fundit i hartuar nga Konsulenca dhe Grupi Punues (GP), dhe ky draft është përcjellë te Grupi Punues (GP), për komentim. Pas trajtimit të komenteve është finalizuar drafti-final i cili është i gatshëm për diskutim paraprak dhe publik.
III.1.2	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me ligjin për Efiçiençën e Energjisë (EE).	2024	€ -	-	€ 90,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, MMPHI , FKEE	Miratimi i legjislacionit sekondar lidhur me ligjin për Efiçiençën e Energjisë (EE).	Ligji për Efiçiençën e Energjisë (EE).	Sipas planifikimit, aktiviteti pritet të fillojë pas aprovimit të ligjit për Efiçiençën e Energjisë (EE).

III.1.3	Rishikimi i ligjit për performancën energjetike të ndërtesave.	2023	€ 22,600.00	-	-	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët	MMPHI	Ligji për performancën energjetike të ndërtesave i miratuar.	Plani Kombëtar i Zhvillimit për periudhën 2023-2025	Ka përfunduar.
III.1.4	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me performancën energjetike të ndërtesave.	2024	€ 150,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	MMPHI	Miratimi i legjislativitetit sekondar në lidhje me performancën energjetike të ndërtesave.	Ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Nuk ka progres.
III.1.5	Zhvillimi i regjistrit kombëtar për performancën energjetike në ndërtesa.	2023	€ 90,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës: € 20,000 Donatorët: € 90,000	MMPHI, ME	Ekziston një regjistër kombëtar funksional.	Ligji për EE & ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Regjistri Kombëtar është në proces të ndërtimit dhe testimave sa i përket fushës së Performancës Energjetike në Ndërtesa, konkretisht është punuar në procesin narrativ të CPE-ve. Projekti është duke u zhvilluar me perkrahje nga KEP-GIZ dhe me bashkpunim me Ministrin në Ekonomisë (ME), është instaluar si sistem në serveret e AShI-së.
III.1.6	Hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Rinovimit të Ndërtesave.	2024	€ -	€ -	€ 25,000.00	€ -	Donatorët	MMPHI	Strategjia e Rinovimit të Ndërtesave e miratuar.	Ligji për EE & ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Ky aktivitet fillon pas hyrjes në fuqi të ligjit për performancë energjetike në ndërtesa.

III.1. 7	Fushata për ndërgjegjësimin e publikut.	Vjetore	€ 10,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, FKEE, MMPHI	Fushatat për ndërgjegjësimin e publikut të organizuar	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres.
III.1. 8	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (niveli qendror).	2023	€ -	€ 2,400,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët (BB).	ME	Dymbëdhjetë (12) ndërtesa publike në nivelin qendror (05. ktoc).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	LOT 1- Renovimin e gjashtë (6) ndërtesave spitalore që gjenden në Qendrën Spitalore në QKUK-punimet në katër (4) objektet spitalore kanë përfunduar në maj, ndërsa për dy (2) objektet e mbetura punimet kanë vazhduar LOT-2 - Kontrata për renovimin e gjashtë (6) ndërtesave publike tri (3) objekte spitalore dhe tri (3) objekte administrative në: Prishtinë, Prizren, Gjakovë dhe Gjiilan - punimet kanë filluar në muajin shkurt dhe pritet të përfundojnë në nëntor të vitit 2024.

III.1. 9	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike (në nivelin komunal).	Vjetore	€ 6,435,06 1.23	€ 9,924,938 .77	€ 500,000.0 0	##### ###	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët (BE, BB-KEEREP).	FKEE	Kursimi i energjisë rreth 3 ktoe/vit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	<p>Fondi i Kosovës për Efiçencë të Energjisë (FKEE), ka publikuar dy thirrje publike në vitin 2020 dhe 2021 me anë të cilave ka ftuar të gjitha komunat që të aplikojnë për ndërtesat publike dhe sistemet e ndriçimit të rrugëve, me qëllim të përmirësimit të Efiçencës së Energjisë (EE), në kuadër të Projektit Komunal për Efiçencë të Energjisë (MEEP) të mbështetur nga Banka Botërore (BB), Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga këto thirrje janë nënshkruar njëqind e pesëdhjetë (150) Marrëveshje për Fillimin e Projektit dhe nga to për tetëdhjetë e gjashtë (86) objekte Fondi i Kosovës për Efiçencë të Energjisë (FKEE), ka nënshkruar Marrëveshje për Shërbime të Energjisë me komunat. Në kuadër të këtyre projekteve janë lidhur kontrata për konsulencë (auditim energjetik, dizajn dhe mbikëqyrje) dhe ato për zbatimin e punëve. Gjatë periudhës janar-qershor 2024 ka përfunduar Auditimi Energjetik (AE), dhe dizajnimin i tridhjetë e katër (34) objekteve të reja nga thirrjet publike paraprake, dhe për shtatëmbëdhjetë (17) është vazhduar përgatitja për tenderim të kontratave punë kryerëse dhe kontrata të mbikëqyrjes. Numri i projekteve të përfunduara në total është ende tetëdhjetë e tre (83), dhe vlera e kursimit të energjisë është 1.67 ktoe/vit. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 15,334,426.52 €.</p>
-------------	--	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------	--	------	---------------------------------------	--	--

III.1.10	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike (në nivel komunal).	2023	€ -		€ 2,500,000.00	##### ###	Buxheti i Kosovës (BK), KfW, WBIF	ME	Tetë (8) objekte shkollore (1 ktloe)	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është themeluar njësia për implementimin e projektit.
III.1.11	Korniza e qyteteve të gjelbërta 2 - Efiçienca e Energjisë (EE) në ndërtesa publike në Prishtinë.	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ 2,000,000.00	##### ###	Kredi nga EBRD	Komuna te Prishtinës	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) deri në dyzet e shtatë (47) ndërtesa në pronësi të komunës. Kursimi i energjisë 1 ktloe	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres.
III.1.12	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike në Prizren.	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ 2,000,000.00	##### ###	Kredi nga EBRD	Komuna e Prizrenit	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) deri në dyzet e shtatë (47) ndërtesa në pronësi të komunës. Kursimi i energjisë 1 ktloe	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres.
III.1.13	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në	2022	€ 4,850,000.00	€ -	€ -	€ -	MMC-Millennium Foundation Kosovo	MFK,ME, Komuna	njëzet e gjashtë (26) ndërtesa shumëbansore të	Ligji për efiçencë të energjisë (EE), Ligji për performanc	Ka përfunduar.

	sektorin rezidencial njëzet e gjashtë (26) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB).								rinovuara, duke arritur kursime deri në tridhjetë përqind (30%).	ën energjetike të ndërtesave, Plani i 4-të Kombëtar i Veprimit për Efiçiençë të Energjisë (EE).
III.1.14	Studimi i fizibilitetit për zbatimin e masave të Efiçiençës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial dhe privat.	2024	€ -	€ -	€ 200,000.00	€ -	Donatorët (WBIF)	FKEE	Studimi i fizibilitetit i përfunduar .	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Është realizuar GAP analyses, po ashtu janë realizuar studimet finale për skemat në sektorin rezidencial dhe janë prezantuar.

III.1. 15	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial (shtëpi individuale).	2024	€ -	€ 5,000,000.00	€ 5,000,000.00	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	FKEE	Kursimi i energjisë - 2 ktoe/ vit	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	<p>Gjatë vitit 2023 Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE) ka publikuar Thirrjen Publike. Thirrjen Publike për Aplikime për Zbatimin e Masave të Eficiencës së Energjisë (EE) për Shtëpitë Individuale të Banimit” me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE), në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga kjo thirrje janë shqyrtuar tremijë e treqind e njëzet e një (3321) aplikime nga to janë para-aprovuar dymijë e njëqind e pesëdhjetë (2150) me një vlerë 8,230,050.00 në listë të pritjes janë një mijë e dhjetë (1010) raste dhe njëqind e gjashtëdhjetë e një (161) janë anuluar.FKEE-ja, ka pranuar rreth një mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e një (1791) aplikime për disbursim, nga shtëpitë që kanë përfunduar punimet. Këto aplikime janë në proces të verifikimit nga nëntë (9) kompani të angazhuara nga FKEE-ja, dhe janë nënshkruar një mijë e pesëqind e dyzet e pesë (1545) marrëveshjet. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 5,530,494.95 €. FKEE-ja, ka iniciuar procesin e trajtimit të listës së pritjes nga thirrja e kaluar dhe janë përgjigjur dyqind e tridhjetë e shtatë (237) shtëpi, njëzet e pesë (25) prej tyre kanë raport të auditimit energjetik ndërsa për dyqind e dymbëdhjetë</p>
--------------	--	------	--------	-------------------	--------------------------	--------	---------------------------------	------	-----------------------------------	--	--

											(212) shtëpi FKEE-ja, ka iniciuar procedurë tenderuese për përgatitjen e auditimeve energjetike.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III.1. 16	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) sociale në pronësi të komunave.	2024	€ -	€ 5,000,000 .00	€ 5,000,000 .00	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	FKEE	Kursimi i energjisë - 2 ktoe/ vit	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Gjatë vitit 2023 FKEE-ja, ka publikuar Thirrjen Publike. Thirrjen Publike për Aplikime për Projektin Emergjent për Masat e Efiçencës së Energjisë (EE) së Ndërtesave Shumë Banesore (NShB), sociale në pronësi të komunave me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE), në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga kjo thirrje janë nënshkruar Marrëveshjet për Inicim të Projektit për njëzet e nëntë (29) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) sociale në trembëdhjetë (13) komuna. Gjatë kësaj periudhe për njëzet e dy (22) ndërtesa është realizuar tenderimi për kontrata zbatuese, ndërsa për gjashtë (6) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) sociale jemi në fazën e përfundimit të dizajnit nga kontrata për konsulencë (auditim energjetik, dizajn dhe mbikëqyrje) pas ngecjes së lëndës në OShP. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 240,763.80 €.
III.1. 17	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial dhe NMVM-të	2025	€ -	€ -	€ -	##### ###	Donatorët (WBIF)	FKEE	Kursimi i energjisë 0.14 ktoe	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar ende.

III.1.18	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial	2022/2023	€ 5,000,00 0.00	€ 10,000,00 0.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët	ME	Skemat e subvencionimit të pajisjeve efiçiente për ngrohje, pajisjeve efiçiente shtëpiake & sistemeve diellore.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres.
III.1.19	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial Ndërmarrjet Mikro, të Vogla, dhe të Mesme – (NMVM).	2023	€ -	€ 5,000,000 .00	€ -	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	ME	Skemat e subvencionimit të pajisjeve efiçiente për ngrohje, pajisjeve efiçiente të punës & sistemeve diellore.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres.
III.1.20	Instalimi i sistemeve solare FV në kompanitë rajonale të ujit (KRU).	2024	€ -	100,000.0 0	€ 14,900,00 0.00	€ -	KfW	ME	Diversifikimi i burimeve të energjisë në KRU-të, rreth njëzet e gjashtë përqind (26%) e konsumit të energjisë do të	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Rishikimi i termave të referencës së projektit nga ME-ja dhe Kfw.

										mbulohet nga BRE-ja.	
III.1.21	Zhvillimi i tregut ESCO	2024 /2025	€ -	€ -	€ 10,000.00	##### ###	Donatorët	ME	Janë zhvilluar tre lloje të kontratave model për ESCO dhe metodologji për përcaktimi në ESCO.	Udhëzimi Administrativ (UA) për ofruesit e shërbimeve të energjisë.	Nuk ka progres.
III.2	Objektivi specifik: Promovimi i kogjenerimit efikas dhe sistemeve efçiente të Ngrohjes Qendrore (NQ)										
	Indikatori	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Rritja e kapacitetit të kogjenerimit në "Termokos" Prishtinë.	140 MWth			140 MWth	280 MWth					
2	Numri i konsumatorëve të lidhur në sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) Prishtinë & Gjakovë.	17,791			24,560	38,240 në Prishtinë dhe Gjakovë. Për komunat e tjera do të vendoset në bazë të studimit të fizibilitetit.					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

III.2. 1	Zgjerimi dhe rehabilitim i rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) të Prishtinës.	Yearly	€ 9,200,00 0.00	€ 6,676,063 .00	€ 2,835,663 .00	##### ###	KfW/Termokos	Termokos	<p>Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031, Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031</p> <p>Punët për realizimin e projektit sipas kontratës T1 (nënstacionet), kanë përfunduar në tërësi, janë instaluar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • treqind e njëzet e pesë (325) nënstatione të reja në pjesën e zgjerimit dhe densifikimit, • dyqind e njëzetë e pesë (225) nënstatione të rehabilituara/zëvendësuara, • tridhjetë e një (31) nënstatione të automatizuara. • Ndërtimi i dy rezervuarëve të nxehtësisë me kapacitet 800m³ (2x400m³), integrimi i këtij sistemi në SCADA dhe rehabilitimi i sistemit për mbajtje të shtypjes në rrjetin shpërndarës. <p>Në periudhën gjashtë (6) mujore janar – qershor 2024, kanë përfunduar këto punime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Janë instaluar dymbëdhjetë (12) nënstatione të reja, • Kontraktori ka punuar në komisionimin përfundimtarë të nënstationeve, punët e izolimit termik dhe përfundimin e sistemit SCADA. • Në pjesën e projektit që i referohet rezervuarëve të nxehtësisë, janë kryer këto punë: <ol style="list-style-type: none"> 1. Izolimi termik i gypave brenda dhe jashtë objektit të ngrohtores për këtë system; 2. Janë zhvilluar punime për funksionalizimin e sistemit për mbajtje të shtypjes, instalimi i dy valvolave rregulluese; 3. Janë zhvilluar punime për funksionalizimin e sistemit për dozim, puna vazhdon edhe më tutje; 4. Janë zhvilluar punime për Instalimin dhe funksionalizimin e sistemit SCADA;
-------------	---	--------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------	--------------	----------	--

III.2. 2	Studimi i fizibilitetit për rritjen e kapacitetit termik në Kogjenerimin TC "Kosova B" nga 140 MWth në 280 MWth	2023	€ -	€ 1,500,000.00	€ -	€ -	IPA 2020 / Komuna e Prishtinës / Termokos	Termokos / KEK	Studimi i fizibilitetit i finalizuar.	Strategjia e Energjisë 2022-2031, Plani Zhvillimor i Termokosit 2022-2031	Në qershor të vitit 2022, është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi, në mes Bankës Evropiane për Investime (EIB), Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës dhe Termokosit, për fondin në vlerë prej 1.5 mil. € për financimin e studimeve paraprake për këtë projekt. Aktualisht, për këtë projekt është në proces përgaditja nga kompania ndërkombëtare konsulente, konzorciumi "TETRA-TECH". Aktivitetet e realizuara dhe në proces lidhur me këtë projekt në periudhën gjashtë (6) mujore janar – qershor 2024 janë: <ul style="list-style-type: none"> • Projekti për dekarbonizim është aprovuar nga bordi i ndërmarrjes në muajin janar 2024; • Vazhdojnë konsultimet me kompaninë konsulente. Bashkëpunimi konsiston në dhënien e shënimeve teknike dhe prezantimin e kërkesave nga ana e Termokosit-it; • Kompania konsulente ka prezentu dizajnin inicial për instalimin e gypave në sallën e turbinave TUH, HES1&HES2 si dhe rrjetit HES-2 HRS-2; • Është duke u punuar në përditësimin e Masterplanit të ri për zgjerimin e rrjetit në kuadër të këtij projekti; • Kompania ka prezentu zonimin e ri (zonat ku duhet të zgjerohet rrjeti). • Është duke u përgaditur vlerësimi ekonomik dhe financiar i projektit; • Është përfunduar Raporti mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe është dërgu te Banka
-------------	---	------	--------	-------------------	--------	--------	---	----------------	---------------------------------------	---	--

III.2. 3	Dyfishimi i kapacitetit të prodhimit të kogjenerimit nga 140 MWth në 280 MWth dhe zgjerimi i rrjetit të transmissio nit.	2025	€ -	€ -	€ 12,000,000.00	##### ###	Donatorët, /Komuna e Prishtinës/Termokos.	Termokos / KEK	Kapacitete termike gjeneruese të dyfishuara. Pritet plotësimi i buxhetit deri në vlerën 80,000,000 nga donatorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Projekti pritët të përfundojë në vitin 2027.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031, Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar realizimi i projektit.
III.2. 4	Instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorët e Termokosit.	2023	€ 6,000,000.00	€ 4,000,000.00	€ -	€ -	FMK	FMK / Termokos	Kostot dhe konsumi i kontrolluar i ngrohjes deri në 17,500 konsumatorë të Termokosit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031, Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031	Kontrata për këtë projekt është nënshkruar në prill të vitit 2022, në mes të MFK (Millenium Foundation-Kosova) dhe kontraktorit "ENERCO LLC" ShPK – Prishtinë dhe ka filluar së zbatuari më datë: 27.07.2022. Projekti është duke u zhvilluar ende. Gjatë periudhës janar - qershor 2024 janë realizuar: Objekte të kryera - një mijë e gjashtëdhjetë e tetë (1068); Valvola termostatike - dyqind katërbëdhjetë (214);

											Alokatorë – nëntë mijë e dyqind e pesdhjetë e pesë (9255); Matës të energjisë termike - shtatëqind e dymbëdhjetë (712), Pompa qarkulluese - gjashtëdhjetë e dy 62.
III.2. 5	Përmirësi mi i performancës së Ngrohjes Qendrore (NQ) në Gjakovë.	2023	€ 2,361,000.00	€ 823,000.00	€ -	€ -	Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Komuna e Gjakovës.	Ngrohja Qendrore (NQ) Gjakova .	Përmirësi mi i performancës së Ngrohjes Qendrore (NQ) Gjakova, përmirësimi i rrjetit të ngrohjes së spitalit rajonal; lidhja e objekteve publike shtesë.	Plani Zhvillimor i Ngrohjes Qendrore (NQ) për periudhën 2022-2023	Nuk ka aktivitete të parapara për vitin 2024.

MBIKQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK 2022-2025: OBJKTIVI STRATEGJIK 4

SO4: FORCIMI I BASHKËPUNIMIT RAJONAL DHE FUNKSIONIMI I TREGUT

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati						
IV.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 4: FORCIMI I BASHKËPUNIMIT RAJONAL DHE FUNKSIONIMI TË TREGUT										
1	Integrimi i tregut me tregjet Pan - Evropiane të energjisë elektrike.	Jo në vend.	Integrimi i tregut me Shqipërinë 2023.	Anëtarësimi në zonën e tregut Pan-Evropiane							
IV.1	Objektivi specifik: Forcimi i bashkëpunimit rajonal										
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031							
1	Kapaciteti i ofruar ndërkufitar/Kapaciteti nominal ndërkufitar.	Eksporti: 22-24%, Importi: 24-26%	Secili drejtim minimum 28-30%	Secili drejtim 70%							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

IV.1.1	Bashkimi me tregun një ditë-para me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX.	2023	€ -		€ -	€ -	ALPEX		Integrimi i tregjeve me shumicë të energjisë elektrike.	Rregullat e ALPEX	Më datë: 31.01.2024 "ALPEX" ShA, ka filluar operimin në zonën tregtare të Kosovës, gjithashtu po në këtë ditë ka filluar edhe bashkimi i tregut Kosovë-Shqipëri (Market Coupling).
IV.1.2	Bashkimi me tregun një brenda-ditës me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX.	2024	€ -	€ 1,400,000.00	€ 1,350,000.00	€ -	ALPEX	ALPEX, KOSTT, ZRrE, ME	Integrimi i tregjeve brenda-ditës të energjisë elektrike.	Rregullat e ALPEX	Janë krijuar dhe miratuar nga ZRrE-ja Rregullat e ALPEX Procedurat për Tregtim dhe Shlyerje, Vendimet Teknike, si dhe Tarifat përkatëse. Planifikohet që gjatë K3 apo K4 2024 të funksionalizohet edhe tregu brenda ditës.
IV.1.3	Studimi i fizibilitetit mbi bashkimin e tregut rajonal/evropian (SDAC, SIDC).	2024	€ -	€ -	€ 250,000.00	€ -	Donatorët, Buxheti i Kosovës (BK).	KOSTT, ZRrE, ME	Integrimi i tregjeve me shumicë të energjisë elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Në Athinë, në nëntor të vitit 2023 është nënshkruar memorandumi për bashkimin e tregjeve nga bursat, TSO dhe rregullatorët e: Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë.

IV.2		Objektivi specifik: Heqja e barrierave për funksionimin efektiv të tregut									
	Indikator	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025				Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Statusi i tërheqjes së MFSH-së.	MFSH-ja ekziston	Fillon heqja e MFSH-së				MFSH-ja nuk ekziston				
2	Numri i ofertave të disponueshme për konsumatorët josthtëpiakë.	1	6				> 6				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-gjershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
IV.2.1	Hartimi dhe miratimi i ligjit për energjinë.	2023	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOST T, KEK	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Projektligji për energjinë ka kaluar diskutimin paraprak, publik, dhe është dërguar për komentim në SKE. Komentet e pranuar nga të gjitha diskutimet, përfshirë ato nga SKE-ja, janë adresuar nga konsulenca (Tetrattech). Drafti aktualisht është duke u trajtuar brenda Ministrisë së Ekonomisë (ME).

IV.2. 2	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për energjinë.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ERO, KOST T	Legjislatiioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas aprovimit të ligjit për energji do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.
IV.2. 3	Hartimi dhe miratimi i ligjit për energjinë elektrike.	2023	€ -	€ 10,800.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Projektligji për energjinë elektrike ka kaluar diskutimin paraprak, publik, dhe është dërguar për komentim në SKE. Komentet e pranuar nga të gjitha diskutimet, përfshirë ato nga SKE-ja janë adresuar nga konsulenca (Tetrattech). Drafti aktualisht është duke u trajtuar brenda Ministrisë së Ekonomisë (ME).
IV.2. 4	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për energjinë elektrike.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT, KEK	Legjislatiioni sekondar i miratuar	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas aprovimit të ligjit për energjinë elektrike që do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.

IV.2.5	Hartimi dhe miratimi i ligjit për rregullatorin e energjisë.	2023	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është përgatitur drafti i projektligjit nga Grupi Punues (GP) ndërinstitucional me mbështetje të konsulentës, dhe është në pritje për t'ju përcjellur në diskutim paraprak.
IV.2.6	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për rregullatorin e energjisë.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas aprovimit të ligjit për rregullatorin e energjisë do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.
IV.2.7	Fillimi i studimeve mbi barrierat e tregut konkurrues të energjisë elektrike, dhe për metodën më të përshtatshme të heqjes graduale të MFSH-së.	2025	€ -	€ -	€ -	€ 50,000.00	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, ZRrE	Rritja e konkurrencës në treg.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar ende.
IV.3	Objektivi specifik: Aftësimi në fushat e lidhura me energjinë dhe përfshirja e grave										

	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031							
1	Numri i të diplomuarve të ri në vit që marrin diplomë akademike, ose kualifikim profesional në programe të reja në fushën e energjisë, dhe fushat e ndërlidhura	J/A	Të përcaktohet.	Të përcaktohet.							
2	përqindja e grave të punësuara në sektorin e energjisë.	9% [2021]	11%	25%							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
IV.3.1	Zhvillimi i programeve të reja të trajnimit teknik.	2024/2025	€ -	€ -	€ 350,000.00	€ 350,000.00	Donatorët	MCAK	Fuqi punëtore e aftë për të ardhmën e Burime ve të Ripërtëritsh me të Energjisë (BRE).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ky projekt do të filloj realizimin në vitin 2025.

IV.3. 2	Përgatitja e infrastrukturës gjithëpërfshirëse gjinore dhe planifikimi i politikave.	2024/ 2025	€ -	€ -	€ 300,000.00	€ 300,000.00	Donatorët	MCAK	njëzet e pesë përqind (25%) gra në fuqinë punëtore të sektorit të energjisë deri në vitin 2031	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ky projekt do të filloj realizimin në vitin 2025.
IV.3. 3	Hartimi i standardeve dhe kurrikulave të reja profesionale, sipas kërkesave të tregut të punës.	2024	€ -	€ -	€ 10,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MASHT	Standardet profesionale dhe kurrikulat e reja të hartuara.		Nuk ka progres.

MBIKQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 5

SO5: MBROJTJA DHE FUQIZIMI I KONSUMATORËVE

Nr.	Objektiva t strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektiv i i vitit të fundit 2031	Rezultati
V.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: MBROJTJA DHE FUQIZIMI I KONSUMATORËVE				
1	Numri i skemave të reja dedikuar konsumatorëve në nevojë.	J/A	2	4	.
2	Numri i programeve që mbështesin projektet e komuniteteve të energjisë në efikasitet dhe vetë konsum.	1	> 2	> 5	
V.1	Objektivi specifik: Mbrojtja e konsumatorëve në nevojë				
	Indikator	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektiv i i vitit të fundit 2031	

1	Skema për mbështetje në çmimeve për konsumatorët në nevojë.	Skema mbështetëse ekzistuese (e pashënjestëruar si duhet) [2021]	Themelimi i programit të ri për konsumatorët në nevojë.				Skemë e bazuar në testin e varfërisë, e lidhur me skemën e reformuar të asistencës sociale.				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
V.1.1	Mbështetja e konsumatorëve në nevojë, përmes skemave ekzistuese të mbështetjes.	Vjetore	€ 4,500,000.00	€ 4,500,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT)	Skemat mbështetëse vjetore.	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2023-2025	Kjo skemë është zevëndësuar me Pilot-programin për Konsumatorë të Cenueshëm që është shpjeguar në V.1.4.
V.1.2	Krijimi i një skeme të re mbështetëse për konsumatorët në nevojë.	Vjetore	€ -	€ -	€ 10,000,000.00	€ 10,000,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).		Skemat mbështetëse vjetore.	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2023-2025	Nuk do të ketë një "skemë" të re, por do të ketë një Program shumëvjeçar, gjë që vetëm se është shkruar në V.1.3

V.1 .3	Hartimi i një programi pesë (5) vjeçar për mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë.	2023/2024	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ -	Donatorët	Hartimi dhe miratimi i programit për konsumatorët në nevojë.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është duke u përgaditur Draft-Programi për Mbrojtje të Konsumatorëve (periudha e zbatimit dhe kohëzgjatja vendoset nga menaxhmenti i MFPT-ve).
V.1 .4	Hartimi dhe miratimi i programit një (1) vjeçar për zbatimin e masave për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë.	2023	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA	Programi një (1) vjeçar i hartuar dhe miratuar.	Vendimi i ministrit për formimin e Grupit Punues (GP).	Programi për periudhën 2023-2024 ka filluar të implementohet në janar të vitit 2024. Nga ky program kanë përfituar 61,069 familje. Subvencioni iu është disbursuar në gjashtë transhe në periudhën janar-korrik 2024 si formë e pageses direkte të një pjesë të faturës.
V.1 .5	Mbështetja përmes subvencionimit të një pjese të faturës për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale, si dhe familjet që përzgjidhen përmes një skeme formale të testuar.	2023	€ -	€ 20,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA	Numri i familjeve në nevojë të mbështetur me subvencionim të drejtpërdrejtë (200,000 përfitues).	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbatja e ndikimit të menjëherëshëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Është përfshirë në kuader të Veprimit 1.4

V.1 .6	Mbështetje përmes subvencionimit të metodave alternative (dru dhe pelet) për qëllime ngrohjeje për grupet e cenueshme.	2023	€ -	€ 5,000,00 0.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA	Numri i familjeve në nevojë që përfitojnë nga mbështetja (10,000 familje).	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbutja e ndikimit të menjëher shëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Është finalizuar në vitin 2023 kanë përfituar rreth 20,000 familje në asistencë sociale subvencionim.
V.1 .7	Mbështetja e familjeve përmes subvencionimit të faturës së muajit aktual të energjisë elektrike, bazuar në përqindjen e kursimeve të energjisë që kanë bërë në krahasime të njëjtin muaj të një viti më parë.	2023	€ -	€ 15,000,0 00.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA	Numri i familjeve të mbështetura përmes kursimit të energjisë	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbutja e ndikimit të menjëher shëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Ka qenë aktive mes muajve tetor 2022-prill 2023 ku kanë përfituar rreth 300,000 familje.
V.2	Objektivi specifik: Fuqizimi i konsumatorëve									
	Indikator	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031				

1	Zbatimi i fushatave vetëdijësuese, dhe informuese për energjinë.	6 [2021]	9 çdo vit	9 çdo vit							
2	Diversiteti dhe krahasueshmëria e shërbimeve të ofruara për konsumatorët.	Nuk ka oferta të disponueshme.	Lansimi i Mjetit për krahasimin e çmimeve.	Oferta alternative të disponueshme për të gjithë konsumatorët.							
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
V.2.1	Krijimi i legjislacionit për Mjetin e Krahasimit të Çmimeve, me udhëzime të detajuara mbi informacionin që do të jepet në Mjet.	2023	€ -	€ 20,000.00	€ -	€ -	Donatorët	ZRrE	Korniza ligjore mundëson zhvillimin e Mjetit të Krahasimit të Çmimeve	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nuk ka progres
V.2.2	Zhvillimi i Mjetit të Krahasimit të Çmimeve	2023	€ -	€ 7,000.00	€ -	€ -	ZRrE	ZRrE	Mjeti i Krahasimit të Çmimeve	Strategjia e Energjisë për periudhën	Nuk ka progres

										plotësish t funsion ale.	n 2022- 2031	
V.3												
Objektivi specifik: Ruajtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit												
	Indikatori	Vlera bazë				Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Emetimet e pluhurit, NOx dhe SO ₂ të termocentraleve të linjtit.	TC “Kosova B”: Pluhuri: mbi 300 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 500 mg/ Nm ³ SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³ TC “Kosova A”: Pluhuri: mbi 50 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 600 mg/ Nm ³ SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³				TC “Kosova B2”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 600 mg/ Nm ³ TC “Kosova B1”: Pluhuri: mbi 300 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 500 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³ TC “Kosova A3”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 200 mg/ Nm ³ TC “Kosova A4 & A5”: Pluhuri: mbi 50 mg/ Nm ³ , NOx: mbi 600 mg/ Nm ³ , SO ₂ : mbi 600 mg/ Nm ³		TC “Kosova B”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 200 mg/ Nm ³ TC “Kosova A”: Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 200 mg/ Nm ³				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim janar-qershor 2024	
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025						

V.3 .1	Rritja e kapaciteteve të AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.	2025	-	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPH I, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK).	Ngritja e kapaciteteve për stafin e AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.	Udhëzimi Administrativ (UA) për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.	Gjatë periudhës kohore janar-qershor 2024, në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve për kontrollonin e ndotjes së ajrit në Kosovë” të mbështetur nga JICA, pesë (5) zyrtarë të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK), janë trajnuar për monitorimin, vlerësimin, verifikimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie. Të dhënat nga emetimet nga impiantet e mëdha me djegie janë raportuar në Agjencinë e Mjedisit të Evropës në kuadër të obligimeve Energy community - Reporting on Combustion Plants (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/eu/energycommunity/envzcosca/).
-----------	--	------	---	---------------	----------------------	---------------	-------------------------	--	---	--	--

Fundi i dokumentit
